

**Vanjska (*mid term*)
evaluacija provedbe
Lokalne razvojne strategije
LAG-a 5 u razdoblju 2017. -
2020. godine**



Sadržaj

Popis korištenih kratica.....	3
1. Uvod.....	4
2. Osnovne informacije o LRS.....	6
3. Dosadašnja provedba LRS.....	15
3.1. Provedba podmjere 19.2.....	15
3.1.1. Struktura korisnika.....	17
3.2. Provedba podmjere 19.3.....	18
3.3. Provedba podmjere 19.4.....	19
4. Vrednovanje provedbe putem pokazatelja LRS.....	23
6. Provedbeni kapaciteti LAG-a 5.....	26
6.1. Ured LAG-a 5.....	26
6.2. Upravni odbor.....	27
6.3. Skupština.....	28
6.4. Nadzorni odbor.....	28
7. Vanjsko okruženje.....	28
8. Analiza rizika i provedenih aktivnosti za ublažavanje.....	30
10. Evaluacijska pitanja.....	33
11. Zaključci s preporukama.....	40
Popis slika i tablica.....	41
PRILOG 1 Pregled odabranih i odobrenih projekata na 31.12.2020. godine.....	42
PRILOG 2 Pregled provedbe aktivnosti ublažavanja rizika.....	46
PRILOG 3 Pregled projekata i aktivnosti LAG-a financiranih izvan M19 PRR-a.....	48
PRILOG 4 Pregled objavljenih LAG natječaja.....	49
PRILOG 5 Popis aktivnosti Upravnog odbora LAG-a 5 vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2019. godine.....	50



Popis korištenih kratica

LAG – Lokalna akcijska grupa

LRS – Lokalna razvojna strategija

TO – Tip operacije

LEADER – fra. Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veze među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva

CLLD – eng. Community Led Local Development - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

PRR – Program ruralnog razvoj

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

SC – Strateški cilj

PM – Prioritetna mjera

OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

MP – Ministarstvo poljoprivrede

LHM – Leader mreža Hrvatske

UO – Upravni odbor

NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija

ESF - Europski socijalni fond

CVP - Ciljna vrijednost pokazatelja

1. Uvod


LAG 5 neprofitna je organizacija čija je temeljna zadaća decentralizirana raspodjela sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem LEADER/CLLD mjere. LAG 5 osnovan je 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj Dubrovačko–neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave: Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku. Područje LAG-a 5 ima 790,71 km², a sastoji se od 85 naselja u kojima živi 25 203 stanovnika ili 20 % ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj LAG-a 5 je izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 2014 - 2020 kreirana je u periodu od srpnja 2015. do ožujka 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19. „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Nakon konačnog usvajanja od strane Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede, temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ te je konačnom Odlukom o odabiru LAG-a od 9. siječnja 2017. godine LAG 5 odabran za provedbu LRS.

Predmet evaluacije je ocjena provedbe odabrane Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) LAG-a 5 2014.-2020., tj. provedba podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u među-evaluacijskom razdoblju od 2017. do kraja 2020. godine.

LRS LAG-a 5 predviđa provođenje dvaju vanjskih vrednovanja, jedno u među-evaluacijskom razdoblju, tzv. *mid-term* vrednovanje (2020. godine) i jedno nakon završetka provedbe, tzv. *ex post* vrednovanje (2023. godine). Ovo vrednovanje provedeno je od strane vanjskog stručnjaka sukladno metodologiji i indikatorima za mjerenje učinka provedbe LRS. Evaluacija se sastoji od evaluacije provedbe LRS LAG-a 5 te internih akata LAG-a, koji omogućuju postupanje i realizaciju planiranih mjera kojima je svrha dostizanje ciljeva usvojenih u LRS. Također evaluacija uključuje horizontalnu evaluaciju koja obuhvaća tijela donošenja odluka – Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor, operativna tijela za provedbu LRS – stručnu službu, LAG administratore, volontere te praćenje, odnosno analizu dosadašnjih godišnjih izvješća o radu, koja se usvajaju na Skupštini te dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede. U procesu praćenja i procjene vodit će se briga o osnovnim evaluacijskim kriterijima:

- Relevantnost (odabir prioriteta, odabir korisnika, metodologija),

- 
- Djelotvornost (ostvarene koristi, ciljevi, upravljački kapacitet LAG-a, uključenost ključnih dionika),
 - Učinkovitost (ostvareni kvantitativni i kvalitativni pokazatelji učinka, rezultata i izlaza),
 - Ostvarena promjena (ostvareni ciljevi),
 - Održivost (korisnika/projekata, LAG-a, programa)
 - Koherentnost (dosljednost u odnosu na relevantne politike, strategije i programe),
 - Dodana vrijednost u zajednici (postizanje horizontalnih ciljeva).

Polazište i temelji za provedbu postupka evaluacije LRS LAG-a 5 u razdoblju 2017. – 2020. godine predstavljaju svi relevantni dokumenti, izvješća, odluke i propisi povezani s uspostavom, funkcioniranjem i radom udruge te oni nastali u procesima dosadašnjeg raspisivanja LAG natječaja te odabira projekata na LAG razini:

- Statut LAG-a 5,
- Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAG-a 5
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave LAG-a 5
- Godišnja izvješća o radu LAG-a 5
- Izvješća o provedbi LRS 2014 - 2020 LAG-a 5

2. Osnovne informacije o LRS

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 2014 – 2020 izrađena je u razdoblju od lipnja 2015. do ožujka 2016. godine, kada je usvojena od Skupštine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Izrada strategije temeljena je na osnovnim načelima LEADER/CLLD pristupa, a izrađena je konzultacijskim procesom vanjskog stručnjaka i članova formirane radne skupine za izradu strategije u kojoj su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora i to dionici s čitavog područja LAG-a, članova Upravnog odbora, članova Skupštine LAG-a, ali i drugih dionika koji su pokazali interes za zajednički razvoj. Dionici su, uz stručno vođenje, sami kreirali i izrađivali dijelove LRS i sudjelovali u interaktivnim radionicama. Kao i ranije, fokus u pristupu izradi nije bio samo na tome da LRS bude razvojni dokument, nego da je to proces načina mišljenja i djelovanja svih dionika s područja LAG-a 5 u razvojnim aktivnostima. U samom procesu izrade održan je niz pripremnih sastanaka i konzultacija, individualnih i s manjim skupinama, te interaktivne radionice i razmjena radnih materijala između svih dionika putem interneta. Na njima je sudjelovalo 611 dionika, predstavnika raznih društvenih skupina s područja LAG-a 5. Održavali su se na 12 lokacija na području svih jedinica lokalne samouprave LAG-a 5 područja, kako bi se olakšalo sudjelovanje što većeg broja dionika, jer je područje LAG-a 5 prostorno rascjepkano i međusobno slabo prometno povezano.

Prema opisanim financijskim kapacitetima te financijskom planu provedbe, LRS LAG-a 5 je inicijalno programirana na ukupne rashode za provedbu tipova operacija te postizanje prioritetnih mjera i strateških ciljeva na iznos od 1.204.875,00 EUR, od čega 918.000,00 EUR-a za provedbu podmjere 19.2., sukladno definiranoj simulaciji Upravljačkog tijela (Ministarstvo poljoprivrede). Usvojena je na Skupštini 24.03.2016. Zahtjev za potporu (19.2.1) je podnesen u lipnju 2016, nakon čega je Agencija donijela odluke o privremenoj dodjeli sredstava (03.11.2016. godine), a protekom roka za prigovore i Odluke o konačnoj dodjeli sredstava (09.01.2017.). Zbog viška raspoloživih sredstava Agencija je provela postupak uvećanja pa su sredstva dodijeljena u konačnoj odluci uvećana, u iznosu od ukupno 1.101.121.875,00 EUR, od čega 838.950 EUR-a za provedbu podmjere 19.2, 41.947,50 EUR-a za provedbu podmjere 19.3 te 220.224,38 EUR-a za provedbu podmjere 19.4.

U postupku odabira LAG-a temeljem provedenog postupka rangiranja LAG 5 je ostvario ukupno 47 bodova pri čemu je za ocjenu kvalitete lokalne razvojne strategije ostvareno 20 bodova, za kriterij broja stanovnika unutar LAG-a 7 bodova, za kriterij broja jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a 10 bodova, te za kriterij udjela (%) civilnog i gospodarskog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a 10 bodova.

Odlukom o privremenom odabiru LAG-a od 3. 11. 2016., LAG-u 5 su dodijeljena sredstva sukladno simulaciji, no konačnom Odlukom o odabiru LAG-a od 9. 1. 2017. godine LAG-u su dodijeljena uvećana sredstva kako je iskazano u tablici 1.

Tablica 1. Odobreni iznosi LRS LAG-a 5 prema podmjerama prema Ugovoru

Podmjera	Privremeno dodijeljena sredstva (HRK)	Konačno odobrena sredstva (HRK)	Privremeno dodijeljena sredstva (EUR)	Konačno odobrena sredstva prema (EUR)
19.2.	5.980.355,20	6.279.372,96	799.000,00	838.950,00
19.3.	299.017,76	313.968,65	39.950,00	41.947,50
19.4.	1.569.843,24	1.648.335,40	209.737,50	220.224,38
UKUPNO LRS	7.849.216,20	8.241.677,01	1.048.687,50	1.101.121,88

Obveze LAG-a 5 u provedbi LRS i upravljanju dodijeljenim sredstvima regulirane su sljedećim aktima:

1. Ugovor o dodijeli sredstava odabranom LAG-u (KLASA: 440-12/16-19-02-01/0048, URBROJ: 343-1400/01-17-010, ID: 767442, br. 5761)
2. Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera (KLASA: 440-12/16-19-02-01/0048, URBROJ: 3431603/01-17-031, od 15. 01.2018.)

Inicijalno izrađena LRS LAG-a 5 (V1) sastojala se od 3 strateška cilja: 1. Razvoj konkurentne, tržišno orijentirane i održive poljoprivredne proizvodnje, 2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti, te 3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5. Za njihovo postizanje predviđeno je 6 prioritetnih mjera i 14 tipova operacija. Potrebno je napomenuti kako su tipovi operacija u lokalnim razvojnim strategijama ekvivalentni onima iz Programa ruralnog razvoja RH, odnosno LAG-ovi nisu mogli samostalno kreirati sve potrebne stavke kod tipova operacija, uključujući prihvatljive aktivnosti, troškove i korisnike, te iznos i intenzitet potpore¹. Izuzetak su bili kriteriji prihvatljivosti, koje su LAG-ovi mogli samostalno kreirati, temeljem specifičnosti prostora LAG-a i vlastitih potreba.


Unatoč navedenom ograničenju u pogledu tipova operacija, definiranje prioritetnih mjera i strateških ciljeva je provedeno adekvatno, što proizlazi iz konzistentnosti ovih triju razina, tj. provedbom odabranih tipova operacija jasno i ciljano se postižu prioritetne mjere, a njihovim ostvarivanjem, postižu se dva temeljno definirana strateška cilja. U tablici 2. iznesen je pregled

¹ Sukladno čl. 13 st. 2 Pravilnika o provedbi podmjere 19 (NN 96/17) i čl. 37 st. 2 Pravilnika o provedbi mjera PRR-a RH (NN91/19), u LRS se za pojedini TO može navesti do 20 % viši intenzitet potpore, ali ne viši od najvišeg propisanog za pojedini TO u Prilogu II Uredbe (EU) br. 1305/13.

definiranih strateških ciljeva te odabranih prioriteta i mjera i tipova operacija u inicijalno izrađenoj strategiji.

Tablica 2. Pregled odabranih strateških ciljeva, mjera i tipova operacija LRS LAG-a 5 – VO

Prioritetni tipovi operacija u programskom razdoblju 2014.- 2020.	Prioritetne Mjere (Aktivnosti) u programskom razdoblju 2014.- 2020.	Strateški razvojni ciljevi LAG-a u programskom razdoblju 2014.-2020.
1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1. Poticanje i uvođenje profitabilnijih načina proizvodnje i podizanje produktivnosti u poljoprivredi i preradi	1. Razvoj konkurentne, tržišno orijentirane i održive poljoprivredne proizvodnje
1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima		
1.1.3. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode		
1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava		
1.2.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta	1.2. Razvoj lokalnih tržišta novih trgovinskih i distribucijskih kanala	
1.2.2. Potpora aktivnosti informiranja i promoviranja		
2.1.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području	2.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti	2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti
2.1.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima		
2.1.3. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		
2.2.1. Korištenje primjene obnovljivih izvora energije	2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije	
3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo	3.1. Ulaganje u infrastrukturu za poboljšanje kvalitete življenja i zaštitu okoliša	3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5
3.1.2. Neproizvodna ulaganja vezana za obnovu staništa i krajobraznih obilježja		
3.2.1. Razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža	3.2. Jačanje suradnje i kapaciteta LAG-a	
3.2.2. Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije		



U razdoblju od 2017. do 2020. godine provedeno je jedno usklađenje (zbog povećanja financijske alokacije od strane Upravljačkog tijela) te tri izmjene LRS LAG-a 5. Izmjene LRS su provedene prvenstveno zbog intervencija u inicijalno odabranim tipovima operacija, tj. nemogućnosti njihovog raspisivanja na LAG razini. Naime, aktivacija tipova operacija od strane Upravljačkog tijela, kao neophodan preduvjet za raspisivanje natječaja na LAG razini, nije se odvijala vremenski usklađeno s inicijalno određenim akcijskim planom provedbe, niti dovoljnim obuhvatom i brzinom. Primjerice, tijekom 2018. godine od strane Upravljačkog tijela u prvom dijelu godine aktiviran je samo natječaj za tip operacije ekvivalentne tipu operacije 6.3.1. PRR, dok je idući natječaj, onaj ekvivalentan tipu operacije 7.4.1. aktiviran sredinom 2018. godine, a Natječaj za provedbu tipova operacija putem LRS koje se također objavljuje od strane APRRR-a za tip operacije srodan 6.3.1. objavljen u drugoj polovini 2018. godine, a za tip operacije 7.4.1. tek u prvom kvartalu 2019. godine. Pregled aktiviranih LAG natječaja te Natječaja za provedbu tipova operacija putem LRS od strane APRRR-a kronološki je iznesen u poglavlju 7. Vanjsko okruženje, iz čega se može zaključiti o neophodnosti provedenih izmjena LRS LAG-a 5.

Drugi razlog provedenih izmjena LRS su promjene potreba krajnjih korisnika (nositelja projekata) u odnosu na inicijalno prikupljene projekte iz baze projektnih ideja. Tako je iskazan pojačani interes za tip operacije 1.1.4. (ekvivalent tipu operacije 6.3.1. PRR-a), pa je s inicijalno alociranih 105.000 EUR-a, odnosno 11,44 % sredstava iz podmjere 19.2., LAG 5 povećao financijsku alokaciju na 285.000 EUR-a, tj. 33,97 % od sredstava iz podmjere 19.2. Time je alokacija za ovaj tip operacije u LRS LAG-a 5 povećana za 171,4 %. Pojačani interes iskazan je i za tip operacije 3.1.1. (ekvivalent tipu operacije 7.4.1. PRR-a), zbog čega je LAG 5 od inicijalne alokacije od 160.000 EUR-a, povećao financijsku alokaciju na 280.896 EUR-a, odnosno za 75,6 %. Također, alokacija za tip operacije 1.1.1. LRS (ekvivalent tipu operacije 4.1.1. PRR-a), povećana je s inicijalno programiranih 104.500 EUR-a na 153.053,16 EUR-a, tj. povećana je za 46,5 %. S druge strane, iskazan je smanjeni interes korisnika za tip operacije 2.1.2. LRS (ekvivalent tipu operacije 6.4.1. PRR-a), pa je od inicijalno programiranih 175.000 EUR-a, alokacija za ovaj tip operacije smanjena na 120.000 EUR-a, tj. za 28,5 %.

Sukladno promjenama u alokacijama za tipove operacija, dogodile su se izmjene financijskih alokacija za pripadajuće prioritetne mjere i strateške ciljeve, dok su pojedine prioritetne mjere u potpunosti izostavljene, zbog nemogućnosti raspisivanja pripadajućih tipova operacija ili smanjenja interesa krajnjih korisnika. U tablici 3. kronološki su navedene sve provedene izmjene LRS, dok je u tablicama 4., 5. i 6. naveden pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima, prioritetnim mjerama i tipovima operacija LRS LAG-a 5.

Potrebno je napomenuti kako je dana 23.01.2019. Upravni odbor LAG-a 5 donio Odluku o isključenju Općine Dubrovačko primorje iz LAG-a 5, uslijed koje je došlo do druge izmjene LRS.


Nakon što je Skupština LAG-a 5 12.2.2019. godine usvojila navedenu izmjenu LRS, APPRRR izmjenu je odobrila 22.7.2019.

Tablica 3. Provedene promjene LRS LAG-a 5 tijekom dosadašnje provedbe

R. B.	Datum donošenja odluke od strane nadležnog tijela LAG-a	Datum podnošenja zahtjeva za odobrenje promjene	Datum donošenja odluke o odobrenju promjene	Vrsta promjene
1.	20.12.2017.	18.01.2018.	16.02.2018.	Usklađenje
2.	07.12.2018.	20.12.2018.	30.01.2019.	Izmjena
3.	12.02.2019.	12.03.2019.	22.07.2019.	Izmjena
4.	08.06.2020.	23.06.2020.	06.08.2020.	Izmjena

Tablica 4. Pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5


Verzija LRS	Financijska alokacija – Strateški ciljevi ²							
	SC1		SC2		SC3		UKUPNO	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Odobrena LRS – V1	350,000.00	38.13	390,000.00	42.48	178,000.00	19.39	918,000.00	100.00
V1_U1	339,981.62	40.53	319,333.33	38.06	179,635.05	21.41	838,950.00	100.00
V2_I1	331,580.00	39.52	267,370.00	31.87	240,000.00	28.61	838,950.00	100.00
V3_I2	331,580.00	39.52	267,370.00	31.87	240,000.00	28.61	838,950.00	100.00
V4_I3	438,053.16	51.96	120,000.00	14.30	280,896.84	33.73	838,950.00	100.00

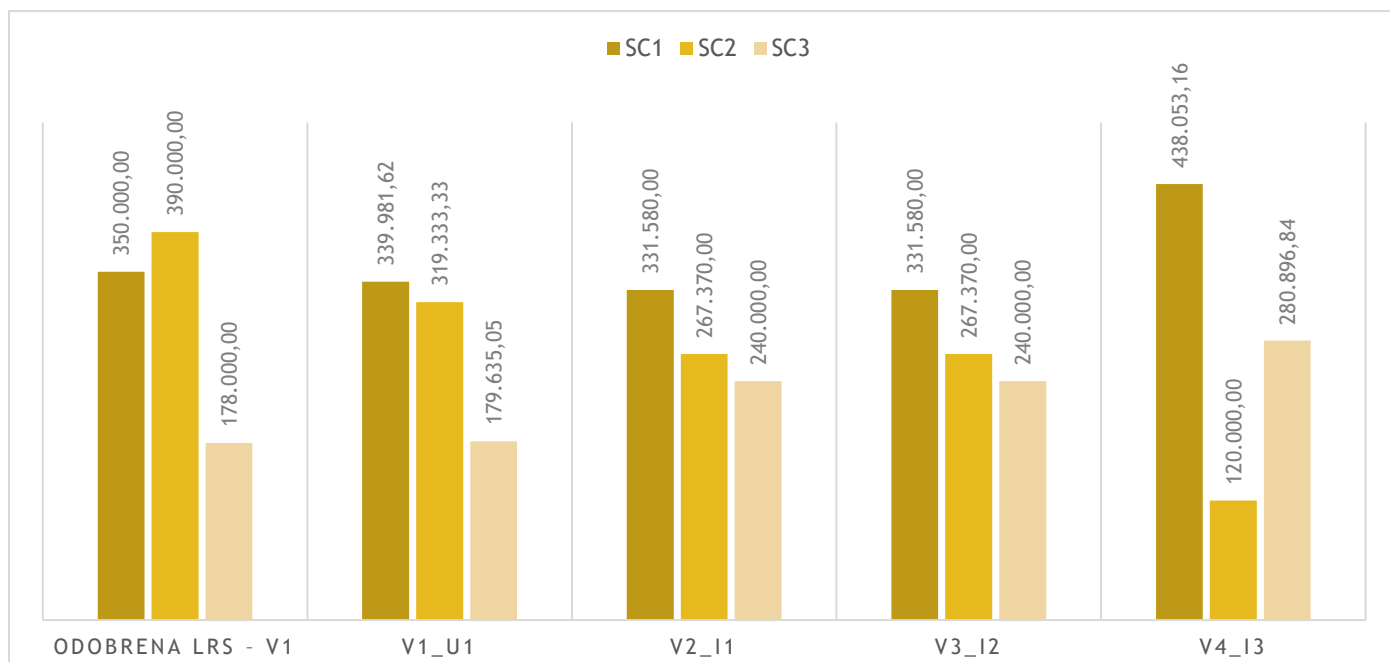

Slika 1 Prikaz izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5

Tablica 5. Pregled izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a 5

Verzija LRS	Financijska alokacija – Mjere									
	M1.1		M1.2		M2.1.		M2.2		M3.1.	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Odobrena LRS – V1	296,500.00	32.30	53,500.00	5.83	360,000.00	39.81	30,000.00	3.27	178,000.00	19.39
V1_U1	291,088.56	34.70	48,893.06	5.83	291,916.66	34.79	27,416.67	3.27	179,635.05	21.41
V2_I1	331,580.00	39.52	0.00	0.00	267,370.00	31.87	0.00	0.00	240,000.00	28.61
V3_I2	331,580.00	39.52	0.00	0.00	267,370.00	31.87	0.00	0.00	240,000.00	28.61
V4_I3	438,053.16	52.21	0.00	0.00	120,000.00	14.30	0.00	0.00	280,096.84	33.48

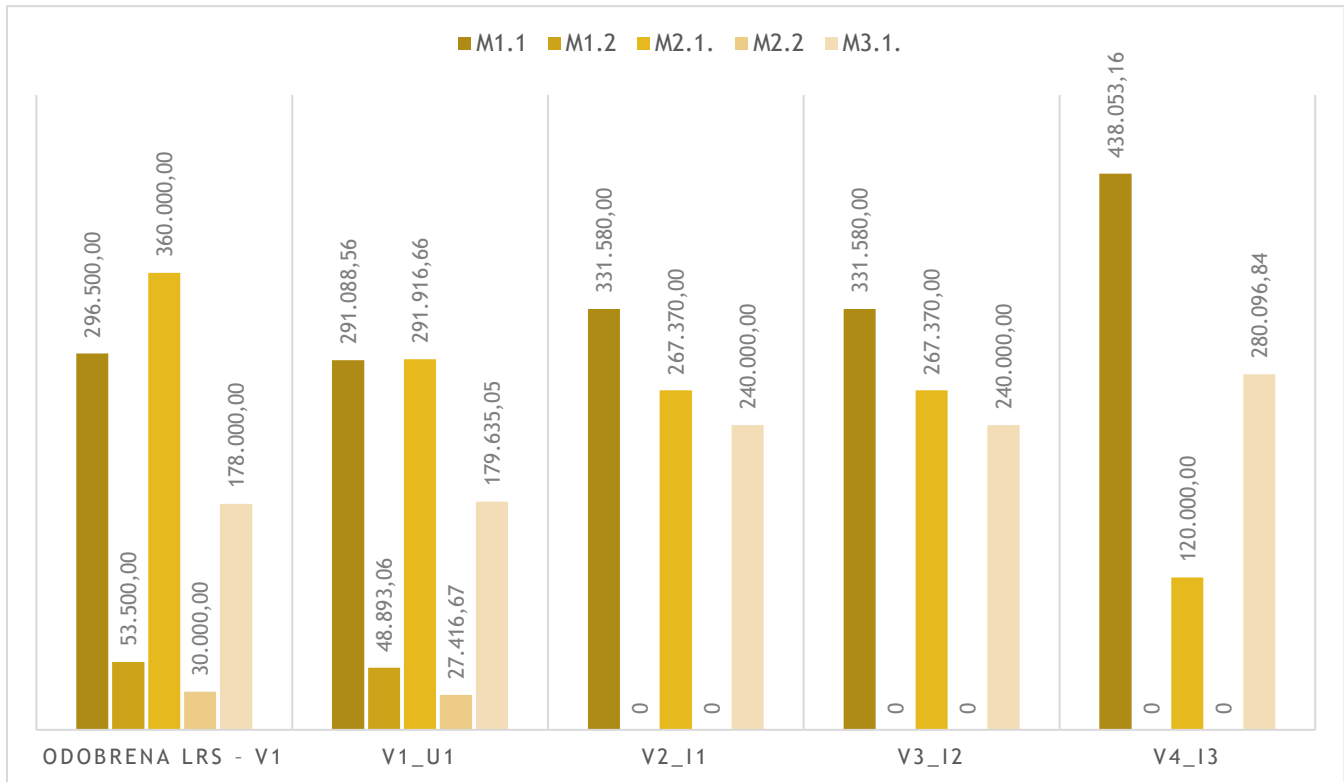


Slika 2 Prikaz izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a 5

Tablica 6. Pregled izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5

Verzija LRS	Financijska alokacija – Tipovi operacija							
	V1		V1_U1		V2_I1 = V3_I2		V4_I3	
TO	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
1.1.1.	11.38	104,500.00	12.70	106,580.23	12.70	106,580.00	18.24	153,053.16
1.1.2.	3.92	36,000.00	3.92	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.	5.56	51,000.00	5.56	46,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.	11.44	105,000.00	12.52	105,000.00	26.82	225,000.00	33.97	285,000.00
1.2.1.	3.87	35,500.00	3.87	32,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.	1.96	18,000.00	1.96	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	16.34	150,000.00	11.92	100,000.00	11.92	100,000.00	0.00	0.00
2.1.2	19.06	175,000.00	19.06	159,930.55	19.95	167,370.00	14.30	120,000.00
2.1.3.	3.81	35,000.00	3.81	31,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.	3.27	30,000.00	3.27	27,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.	17.43	160,000.00	19.45	163,185.05	28.61	240,000.00	33.48	280,896.84
3.1.2.	1.96	18,000.00	1.96	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1*	100.00	45,900.00	100.00	41,947.50	100.00	41,947.50	100.00	41,947.50
3.2.2.**	100.00	240,975.00	100.00	220,224.38	100.00	220,224.38	100.00	220,224.38

*/ ** Tipovi operacija za provedbu podmjera 19.3. i 19.4.

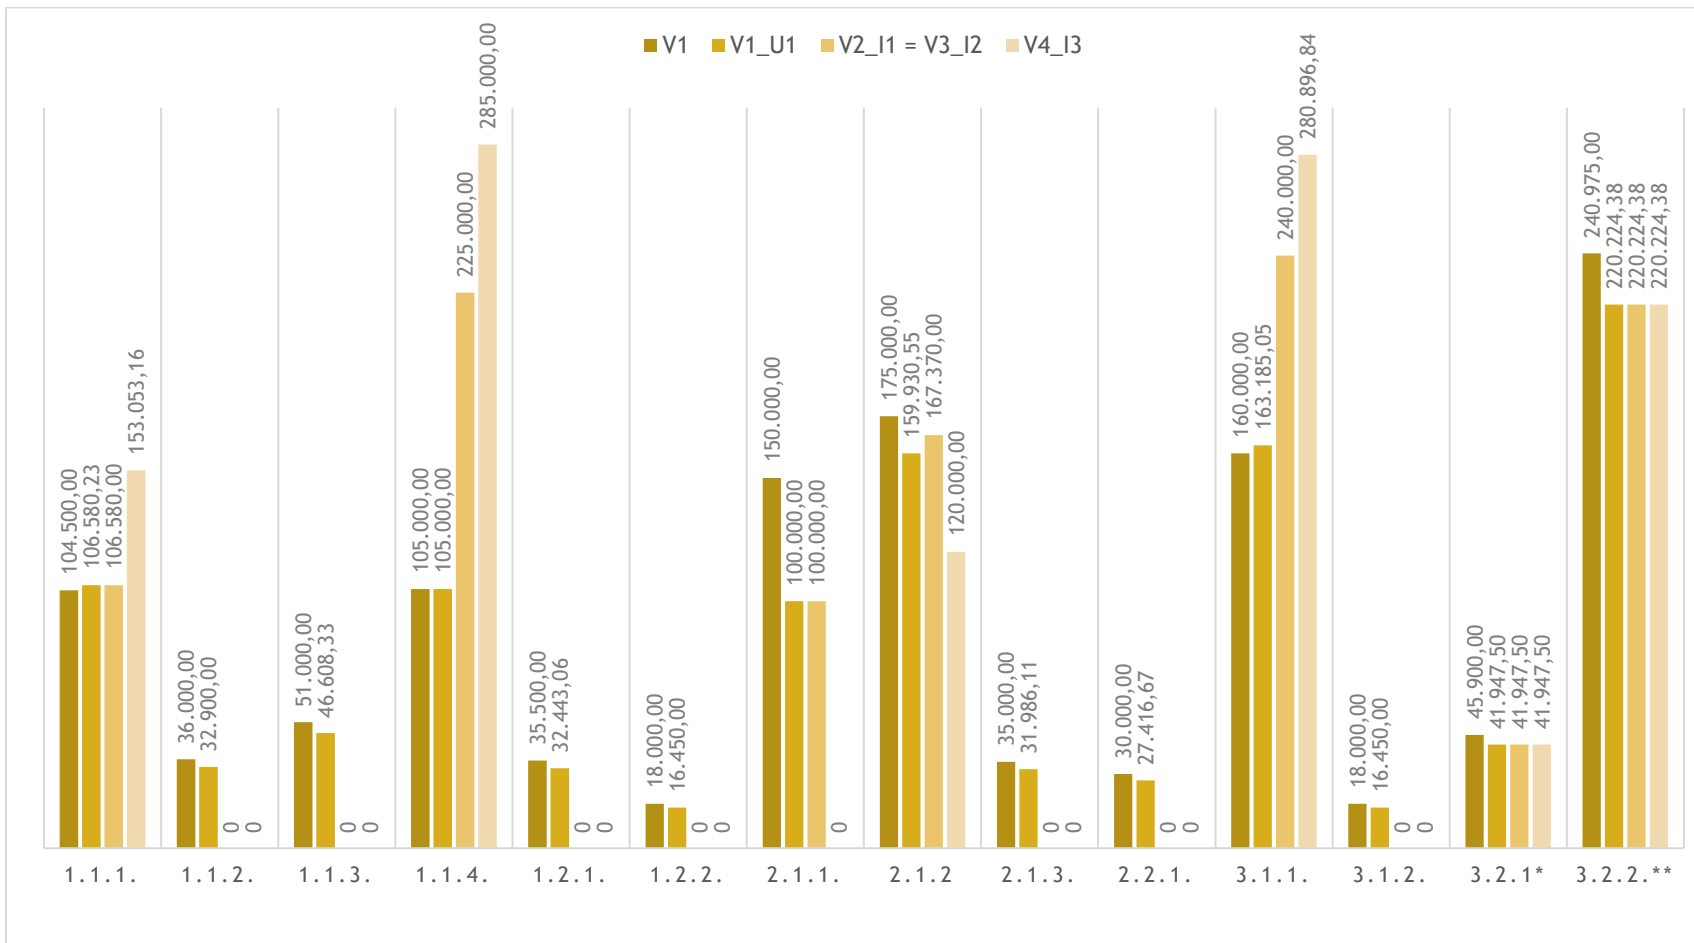

Slika 3 Prikaz izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5

*/ ** Tipovi operacija za provedbu podmjera 19.3 i 19.4

3. Dosadašnja provedba LRS

3.1. Provedba podmjere 19.2.


Sukladno svojoj temeljnoj ulozi provedbe lokalne razvojne strategije, LAG 5 je do kraja 2020. godine raspisao ukupno 8 LAG natječaja pa su sukladno akcijskom planu raspisani svi planirani LAG natječaji.

Dva su natječaja raspisana za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji su ekvivalentni tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja RH, nadalje dva natječaja za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, ekvivalentan tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH, zatim tri natječaja za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, ekvivalentan tipu operacije 4.1.1., te jedan natječaj za tip operacije „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, ekvivalentan tipu operacije 6.4.1. PRR-a.

Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ raspisanog 16. 3. 2018. godine je 781,746.00 HRK. Nakon provedenog postupka izmjene natječaja 13.11.2018. godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava povećan je na 1,675,170.00 HRK. Na natječaj je pristiglo 20 prijava, te je LAG 5 za njih 15 donio Odluke o odabiru, ukupne vrijednosti 1,675,170.00 HRK. Tijekom kolovoza i rujna 2019. godine, APPRRR donosi Odluke o dodijeli sredstava za ukupno 14 projekata. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će korisnici uglavnom provesti modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, te povećati ukupni standardni ekonomski rezultat svojih poljoprivrednih gospodarstava, nabavom različitih biljnih sadnica (masline, agrumi, lavanda), životinja, kupnjom zemljišta i sl. Do 31.12.2020. godine 6 od ukupno 14 projekata iz ovog tipa operacije je završeno.

Ukupna vrijednost drugog LAG natječaja za TO 1.1.4. raspisanog 26.6.2020. godine je 569,250.00 HRK. Na natječaj je pristiglo 25 prijava, a za njih 5 LAG donio Odluke o odabiru dana 20.11.2020. U trenutku provedbe ove evaluacije još nisu podneseni Zahtjevi za potporu APPRRR-u.

Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ raspisanog 03.04.2019. godine, je 1,779,000.00 HRK. Na natječaj je pristiglo 10 prijava, te je LAG 5 za njih 4 donio Odluke o odabiru, ukupne vrijednosti 799,258.46HRK. U svibnju APPRRR donosi odluke o dodijeli sredstava za 3 projekta, a u listopadu 2020. godine i za četvrti. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će



korisnici javnog sektora uglavnom provesti ulaganja u razvoj male ruralne infrastrukture kojom će se značajno pridonijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu. Do 31.12.2020. godine svi su projekti još u fazi provedbe.

Ukupna vrijednost drugog LAG natječaja za TO 3.1.1. raspisanog 04.12.2019. godine je 979,741.54 HRK. Nakon provedenog postupka izmjene natječaja 26.06.2020. godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava povećan je na 1,303,198.22 HRK. Na natječaj je pristiglo 8 prijava, a za njih 6 LAG je donio Odluke o odabiru dana 26.06.2020. Budući da je jedan korisnik odustao od potpore, APPRRR donosi Odluke o dodijeli sredstava za ukupno pet projekata u vrijednosti od 1,165,038.52 HRK. Svi su projekti još u fazi podnošenja drugog dijela Zahtjeva za potporu, a provest će se ulaganja u razvoj male ruralne infrastrukture kojom će se značajno pridonijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva. Na drugom natječaju, osim javnog sektora, potporu je dobila i jedna udruga – udruga Dobre Dobričević sa sjedištem u Lastovu, za projekt Dom kulture u Lastovu.


Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ raspisanog 23.09.2019. godine, je 790,024.25 HRK. Na natječaj je pristiglo šest prijava, te je LAG 5 za njih pet donio Odluke o odabiru, ukupne vrijednosti 695,015.17 HRK, 25.05.2020. U rujnu i listopadu 2020. godine, APPRRR donosi Odluke o dodijeli sredstava za ovih pet projekata. Drugi natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. raspisan je 26.06.2020. godine, a njegova vrijednost je 450,557.12 HRK. Na natječaj su pristigle dvije prijave, te je LAG 5 za njih donio dvije Odluke o odabiru, ukupne vrijednosti 230,900.68 HRK. Do 31.12.2020. godine, APPRRR nije donijela Odluke o rezultatu administrativne kontrole za ove projekte. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će korisnici uglavnom nabavljati novu poljoprivrednu mehanizaciju i pomagala.

Kao posljednja dva u nizu, raspisani su treći LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ dana 20.11.2020. godine ukupne vrijednosti 219,656.44 HRK, te prvi LAG natječaj za provedbu TO 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ vrijednosti 898,176.00 HRK. Do 31.12.2020. godine su još uvijek otvorene prijave na natječaje.

U Prilogu 4 iznesen je pregled do sada raspisanih LAG natječaja s navedenim svim relevantnim informacijama.


3.1.1. Struktura korisnika

Dosad distribucija korisnika odobrenih projekata na LAG 5 natječajima, prema interesnim sektorima, pokazuje kako se najveći udio od 53 % odobrenih sredstava (2.258.507,17 HRK) odnosi na gospodarski sektor, i to poljoprivredu. Idući je prema udjelu od 44 % odobrenih sredstava (1.883.673,21 HRK) javni sektor, dok se na civilni sektor odnosi najmanji udio od 3 % odobrenih sredstava (130.623,77 HRK). Ovakva je distribucija bila očekivana s obzirom na dominantnu prihvatljivost prijavitelja u LAG natječajima koji se odnose na različite organizacijske oblike registrirane za poljoprivrednu djelatnost - obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačke organizacija, poljoprivredne zadruge, obrte registrirane za poljoprivrednu djelatnost, trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (za TO 1.1.4. i TO 1.1.1.) te organizacijske oblike javnog sektora – jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-ova, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave, te civilnog sektora – udruge, zajednice udruga, zaklade, fundacije, vjerske zajednice (za TO 3.1.1.).

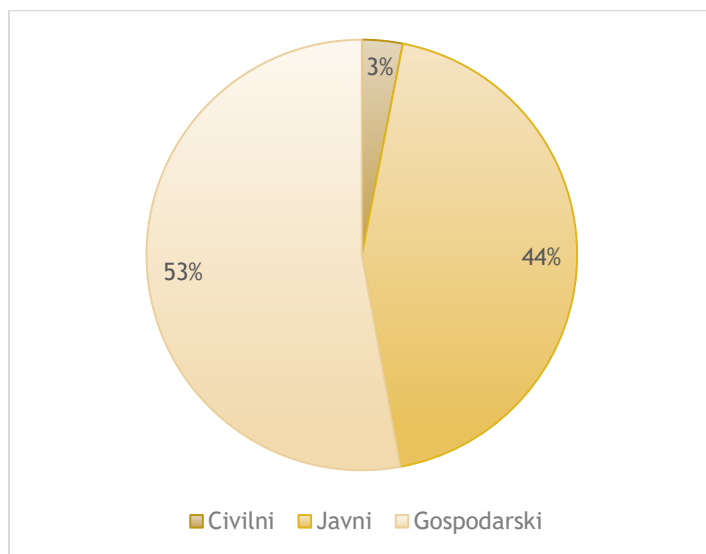

Slika 4 Vrijednost odobrenih projekata prema interesnim sektorima

Distribucija korisnika do sada odobrenih projekata na LAG 5 natječajima prema sjedištu korisnika pokazuje kako se najveći kumulativni iznos od 1.384.371,00 HRK odnosi na korisnike iz Općine Orebić, zatim 851.216,34 HRK na korisnike iz Općine Lastovo, te 520.502,25 HRK na korisnike iz Općine Ston. Slijede potom korisnici iz Općine Smokvica s kumulativnim iznosom odobrenih sredstava od 340.500,00 HRK, iz Općine Vela Luka 273.048,00 HRK, Općine Janjina 174.312,5 HRK, Općine Lumbarda 112.566,38 HRK, Općine Blato 111.678,00 HRK, Općine Dubrovačko primorje 111.678,00 HRK, te Grada Korčule 75.109,6 HRK. Korisnici iz Općine Mljet do sada nisu ostvarili potporu za provedbu projekata financiranu iz podmjere 19.2.

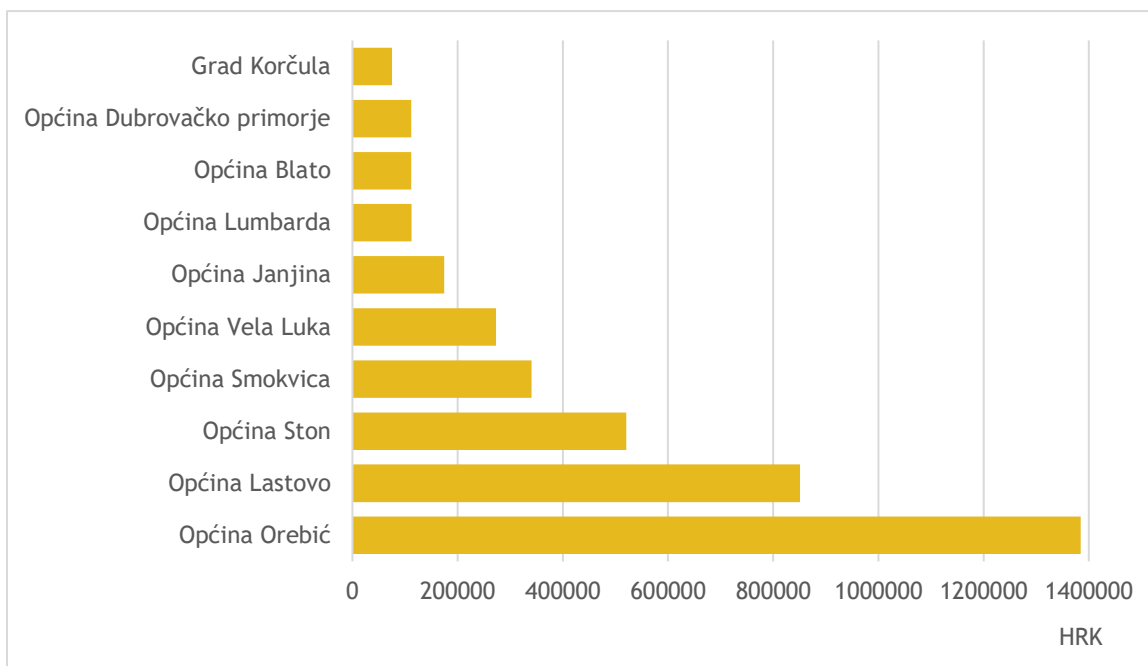

Slika 5 Vrijednost odobrenih projekata prema sjedištu korisnika

3.2. Provedba podmjere 19.3.

Podmjera 19.3. provodi se kroz dva tipa operacija: TO 19.3.1. „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i TO 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Iako je Odlukom o odabiru LAG-u 5 alocirano 41.947,50 EUR za provedbu podmjere 19.3., za odobrenje konkretnog projekta i troškova projekata, LAG-ovi su dužni podnijeti APPRRR-u Zahtjev za potporu temeljem Natječaja za provedbu pojedinog tipa operacije.

U inicijalno izrađenoj LRS LAG-a 5 definirana su dva tematska područja projekata suradnje: 1. na području pčelarstva s nacionalnim i međunarodnim LAG-ovima, te 2. na području inovacija i očuvanja agrobiodiverziteta na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Do sada je LAG 5 proveo jedan transnacionalni projekt suradnje naziva „Bee friends“. Upravni odbor LAG-a 5 je dana 18.07.2018. godine donio odluku o pokretanju ovog projekta suradnje, a projekt se provodio u razdoblju od 1.11.2018. do 31.5.2019. godine. Osnovna tematika projekta je poljoprivreda - sektor pčelarstva, a glavni cilj je promocija područja partnerskih LAG-ova, jačanje pčelarskog sektora te razvojnih resursa tih područja, zaštita prirodne baštine putem povećanja ekološke svijesti i načela održivog razvoja. Partneri na projektu su: Lokalne akcijske grupe LAG 5, Moslavina te poljski LAG-ovi „Ziemia Pszczyńska“ i „Żywiecki Raj“. Kao glavne projektne aktivnosti ističu se nabava opreme za promociju i prodaju pčelarskih proizvoda, priprema i izrada promotivnih materijala, organiziranje pčelarskih radionica i konferencije te studijska putovanja u Poljsku, LAG Moslavinu i LAG 5.

U planu rada LAG-a 5 za 2021. godinu kojeg je usvojila Skupština dana 21.12.2020. godine, planirana je prijava projekta na TO 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekata suradnje“ s LAG-om Brač i LAG-om Škoji naziva „DalmatIMski otoci“. Projektom se planiraju povezati tri otočna LAG-a, kroz razmjenu znanja, primjere dobre prakse, održavanje studijskih putovanja na otocima Braču, Visu i Korčuli. Povezati će se i educirati dionici ruralnog razvoja s područja LAG-ova, s ciljem stvaranja dodatne vrijednosti, promocije i povećanja prodaje lokalnih proizvoda. Provedba projekta planirana je kroz 2021. i 2022. godinu. Iznos sredstava LAG-a 5 namijenjen provedbi ovog projekta suradnje iznosi 220.084,51 kn.

3.3. Provedba podmjere 19.4.

Provedba podmjere 19.4., osim nacionalnim pravilnicima, regulirana je Natječajem za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, provedba tipa operacija 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“. Nastali troškovi refundiraju se kvartalno putem zahtjeva za isplatu.

Troškovi koji su se do sada potraživali kroz podmjeru 19.4. odnosili su se na stavke: 19.4.1.1. "Plaće (temeljem ugovora o radu) zaposlenika LAG-a te troškove vezane uz naknade prijevoza na posao i s posla za zaposlenike LAG-a, 19.4.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS; Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima (uključujući tekuće sastanke u vezi rada LAG-a i LAG Natječaja) seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi provedbe LRS i/ili Programa, na ili izvan područja LAG, 19.4.1.3. Putni troškovi (troškovi navedeni u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a) u vezi događaja iz točke 19.4.1.2.; 19.4.1.4. Troškovi ureda i 19.4.1.5. Usluge vezani uz rad LAG-a. Nadalje, potraživani troškovi za 19.4.2. Animacija su slijedeći: 19.4.2.2. Promidžbene aktivnosti i 19.4.2.3. Usluge.

U tablici u nastavku je prikazan iznos isplaćenih sredstava LAG-a 5 po kvartalima prema podnesenim zahtjevima za isplatu.

Tablica 7. Iznos isplaćenih sredstava LAG-a 5 po kvartalima

Datum podnošenja zahtjeva za isplatu	Datum donošenja odluke o isplati	Iznos isplate	Iznos za troškove zaposlenika	Ostali prihvatljivi troškovi	Neizravni troškovi temeljem fiksne stope	Iznos preostao za korištenje u 19.4
03.04.2017.	21.07.2017.	99,671.44	95,318.41	4,353.03	0.00	1,548,663.96
30.06.2017	16.10.2017.	74,465.43	49,565.45	24,899.98	0.00	1,461,266.97
29.09.2017.	02.01.2018.	72,207.32	49,306.54	22,900.78	0.00	1,389,059.65
22.12.2017.	04.04.2018.	80,623.54	50,283.29	30,340.25	0.00	1,308,436.11
28.03.2018.	30.05.2018.	123,223.20	45,234.91	77,988.29	0.00	1,185,212.91
13.07.2018.	18.09.2018.	91,527.66	55,402.85	36,124.81	8,310.43	1,093,685.25
28.09.2018.	20.11.2018.	91,986.53	61,881.44	30,105.09	9,282.22	1,001,698.72
28.12.2018.	15.05.2019.	90,674.28	54,301.96	36,372.32	8,145.29	911,024.44

23.03.2019.	17.06.2019.	106,809.29	43,354.04	63,455.25	6,503.11	804,215.15
07.06.2019.	31.07.2019.	85,387.88	45,449.97	39,937.91	6,817.50	718,827.27
20.09.2019.	13.12.2019.	59,862.04	27,752.86	32,109.18	4,162.93	658,965.23
24.12.2019.	20.02.2020.	76,048.56	22,141.41	53,907.15	3,321.21	582,916.67
17.03.2020.	16.04.2020.	43,784.70	22,043.01	21,741.69	3,306.45	539,131.97
16.06.2020.	15.07.2020.	73,767.47	44,327.96	29,439.51	6,649.19	465,364.50
11.09.2020.	04.11.2020.	124,236.58	53,430.01	70,806.57	8,014.50	341,127.92

U sklopu podmjere 19.4., s ciljem postizanja adekvatne informiranosti i upućenosti potencijalnih nositelja projektnih prijava i korisnika, LAG 5 je redovito organizirao informativne radionice za potencijalne korisnike u sklopu objavljenih LAG Natječaja, pa je tako da sada organizirano ukupno 32 informativne radionice. Pri tome se vodilo računa o ravnomjernoj prostornoj uključenosti, pa su u sklopu svakog natječaja provedene informativne radionice na svakom od otoka /područja LAG-a 5 – otocima Korčuli, Mljetu i Lastovu, te poluotoku Pelješcu. Uslijed aktualnih prilika uzrokovanih pandemijom COVID 19, pojedine su informativne aktivnosti provedene u *online* formatu.

Tablica 8. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 - Aktivnosti za potencijalne korisnike mjera definiranih LRS LAG-a 5 2014. - 2020.

R.B.	Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Natječaje LRS LAG-a 5 za TO	Broj sudionika	Lokacija održavanja	Datum provedbe
1	1.1.1.	9	Korčula	27.11.2020.
2	2.1.2.	9	Korčula	27.11.2020.
3	1.1.1.	3	On-line	26.11.2020.
4	2.1.2.	3	On-line	26.11.2020.
5	1.1.1.	4	Putnikovići	25.11.2020.
6	2.1.2.	4	Putnikovići	25.11.2020.
7	1.1.1.	6	Putnikovići	03.07.2020.
8	1.1.4.	6	Putnikovići	03.07.2020.
9	1.1.1.	5	Ston	03.07.2020.
10	1.1.4.	5	Ston	03.07.2020.
11	1.1.1.	3	Korčula	02.07.2020.
12	1.1.4.	3	Korčula	02.07.2020.
13	1.1.1.	5	Potomje	01.07.2020.
14	1.1.4.	5	Potomje	01.07.2020.
15	3.1.1.	2	Babino polje	14.01.2020.
16	3.1.1.	2	Korčula	11.12.2019.
17	3.1.1.	5	Ston	10.12.2019
18	3.1.1.	2	Vela Luka	10.12.2019.
19	3.1.1.	2	Smokvica	10.12.2019

20	1.1.1.	4	Lastovo	08.11.2019.
21	1.1.1.	7	Babino polje	04.10.2019
22	1.1.1.	4	Trpanj	02.10.2019.
23	1.1.1.	8	Putnikovići	02.10.2019.
24	1.1.1.	4	Vela Luka	01.10.2019.
25	1.1.1.	3	Smokvica	01.10.2019.
26	1.1.1.	5	Orebić	03.09.2020.
27	3.1.1.	2	Orebić	11.04.2019.
28	3.1.1.	2	Korčula	10.04.2019.
29	3.1.1.	2	Ston	09.04.2019.
30	1.1.4.	5	Putnikovići	28.03.2018.
31	1.1.4.	6	Vela Luka	27.03.2018.
32	1.1.4.	4	Smokvica	27.03.2018.

U cilju jačanja kapaciteta LAG-a 5 za provedbu LRS i implementaciju LEADER/CLLD pristupa, zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su u aktivnostima u organizaciji LEADER mreže Hrvatske (LMH) čiji je LAG 5 član, Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a i drugih LAG-ova, odnosno pravnih osoba koje se bave implementacijom pristupa razvoja vođenog zajednicom. Tematika održanih radionica i konferencija relevantna je za provedbu Mjere 19. Sudjelovanjem stručne službe LAG-a 5 na ovim događanjima pridonijelo se jačanju kapaciteta zaposlenika LAG-a te uspješnosti dosadašnje provedbe LRS i rada LAG-a.

Tablica 9. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4. - Sudjelovanje članova, zaposlenika i volontera LAG-a 5 na radionicama, sastancima i konferencijama vezanim uz provedbu Mjere 19 i LEADER/CLLD pristupa i provedbe LRS u organizaciji drugih pravnih osoba

R. B.	Naziv aktivnosti	Tip aktivnosti	Broj sudionika	Organizator	Datum provedbe
1.	Okvir za strateško programiranje LRS 2021-2027 –Dio I: Opis područja koje obuhvaća LRS (Analiza stanja) – Uvod u metodologiju	radionica	3	LMH	22.12.2020.
2.	„Stanje provedbe LEADER/CLLD, aktivacija tipa operacije 6.4.1. i pripreme za naredno razdoblje“)	radionica	3	MP, LMH, HMRR	27.10.2020.
3.	LEADER/CLLD - metode i mogućnosti provedbe	radionica	2	MP	23.07.2020.
4.	Stanje provedbe M19, Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2019. Natječaj za 19.3.1. i 19.3.2.	radionica	1	MP	27.11.2019.
5.	See Leader	konferencija	7	LMH	20.11.2019.
6.	Aktivacija LAG natječaja za TO 6.1.1.	radionica	1	MP, APPRRR	12.07.2019.

7.	ZJN i izmjene natječaja 19.3. i 19.4.	radionica	1	MP, APPPRR	11.06.2019.
8.	Decentralizirana provedba Programa ruralnog razvoja putem odobrenih LAG-ova – analiza primjera dobre prakse i kako ih primijeniti	radionica	1	LMH	09.05.2019.
9.	Priprema za praćenje i vrednovanje provedbe LRS i rada LAGova RH	radionica	1	LMH	16.04.2019.
10.	Posjet projektu („site visit“) od strane LAG-a u okviru LAG natječaja za tip operacije 6.3.1.	radionica	1	MP	15.04.2019.
11.	Provedba M19	radionica	1	MP, LMH	20.03.2019.
12.	Radionica za potencijalne korisnike mjera PRR	radionica	1	MP	14.12.2019.
13.	Integrirani lokalni razvoj provedbo LEADER/CLLD-a, uvod u vrednovanje provedbe LRS i jačanje međusobne suradnje LAGova	radionica	1	LMH	14.11.2018.
14.	Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja - analiza provedbe M19 unutar PRR-a RH	radionica	1	MP	03.10.2018.
15.	Implementacija Lokalnih razvojnih strategija u okviru LEADER (CLLD) podmjera 19.2., 19.3. i 19.4., Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – uvodna iskustva i obveze LAG-ova	radionica	1	LMH	05.05.2018.
16.	Struktura i rad LAG-a 5 u postupcima provedbe LAG natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru M19	radionica	1	LAG 5	30.10.2017.
17.	Provedba LRS unutar M19 PRR-a RH 2014-2020	radionica	1	MP, Mreža za RR, APPPRR	09.11.2017.
18.	Priprema za implementaciju metodologije provedbe LEADER/CLLD podmjera 19.2. i 19.3. u okviru M19 PRR-a RH	radionica	1	LMH	28.06.2017.
19.	Financijsko upravljanje EU projektima; upravljanje projektom LEADER/CLLD podmjera 19.2., 19.3., 19.4. u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.	radionica	1	MP	22.03.2017.

4. Vrednovanje provedbe putem pokazatelja LRS

Vrednovanje postignutih pokazatelja prema strateškim ciljevima i tipovima operacija u među-evaluacijskom razdoblju (do kraja 2020. godine) provedeno je s obzirom na naznačene vrijednosti indikatora (mjerljivih pokazatelja) rezultata (*result indicators*) u LRS, te su prikazane u tablicama 10. i 11.

Prema tablici 10., do kraja među-evaluacijskog razdoblja (kraj 2018. godine), u sklopu tipova operacija iz strateškog cilja 1., planirano je na LAG razini odobriti 14 projekata u iznosu 210.000,00 EUR-a. Do trenutka provedbe ove evaluacije (kraj 2020.), na LAG razini je odobreno 301,745.83 EUR-a za ukupno 19 projekata, što je posljedica kasnije provedbe evaluacijskog postupka.

Prema akcijskom i financijskom planu provedbe, raspisivanje natječaja za realizaciju strateškog cilja 2. predviđeno je nakon među-evaluacijskog razdoblja, pa su planirani i realizirani pokazatelji jednaki 0. Natječaj za tip operacije 2.1.2. LRS u sklopu ovog strateškog cilja raspisan je krajem studenog 2020. godine i u ovom trenutku prijave su još u tijeku.

U sklopu strateškog cilja 3, do kraja među-evaluacijskog razdoblja (kraj 2018.) planirano je ugovoriti 110.112,19, za 0 projekata, te realizirati jedno novo radno mjesto. Navedena planirana sredstva odnose se na podmjeru 19.4. kao TO 3.2.2 LRS, dok prema prvotnom akcijskom planu provedbe nije bilo planirano provođenje preostalih TO za postizanje strateškog cilja 3 u ovom među-evaluacijskom razdoblju. Međutim, izmjenama akcijskog plana provedbe i izmjenama LRS, do kraja 2020. na LAG razini je odobreno 262,438.14 EUR-a.

Prema tablici 11., vidljivo je da je LAG 5 na dan 31.12.2020. godine postigao većinu od planiranih pokazatelja isporuke po tipovima operacija. Štoviše, za neke od pokazatelja LAG 5 je do sada postigao višestruko veće ciljane vrijednosti, posebice one iz TO 19.4.1, što ukazuje visoku angažiranost ureda i djelatnika LAG-a 5 u ovim aktivnostima.

Tablica 10. Pregled ostvarenih indikatora prema strateškim ciljevima do 2020. godine

Strateški cilj	Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata - Planirano			Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata – Postignuto		
	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata	Ukupna javna sredstva odobrenih projekata (2020.) (EUR)	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata ²	Ukupna javna sredstva odobrenih projekata (2020.) (EUR) ³	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata
SC1	14	210.000,00	0	19	301,745.83	0
SC2	0	0	0	0	0.00	0
SC3	0	110.112,19	1	0	262,438.14	0

² Odnosi se na projekte odobrene za financiranje na LAG razinu, za koje je LAG 5 donio Odluku o odabiru

³ Odnosi se na javna sredstva odobrenih projekata na LAG razinu, za koje je LAG 5 donio Odluku o odabiru

Tablica 11 Pregled planiranih i postignutih pokazatelja isporuka do 31.12.2020. godine za tipove operacije

Naziv pokazatelja isporuka	CVP - Planirano	Postignuto 31.12.2020.	Tip operacije
Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	1	2	3.2.1. (19.3.2.)
Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	10	95	3.2.1. (19.3.2.)
Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	6	36	3.2.2. (19.4.)
Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	60	139	3.2.2. (19.4.)
Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2)	0	0	3.2.1.
Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna razina) 19.3-19.3.1+19.3.2)	0	1	3.2.1.
Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	2	0	3.2.2. (19.4.)
Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	20	0	3.2.2. (19.4.)
Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	5	1.1.1.
Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	14	14	1.1.4.
Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	2.1.2.
Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	2	3.2.1. (19.3.2.)
Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	95	3.2.1. (19.3.2.)
Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	3	68	3.2.2. (19.4.1.)

Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	30	246	3.2.2. (19.4.1.)
Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	12	68	3.2.2. (19.4.1.)
Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	120	245	3.2.2. (19.4.1.)
Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura	0	0	3.1.1.

6. Provedbeni kapaciteti LAG-a 5

Sukladno LRS LAG-a 5, a u skladu sa Statutom udruge i drugim internim aktima, provedbene kapacitete LAG-a 5 čine sva relevantna tijela udruge i ljudski kapaciteti zaduženi za djelovanje udruge i obavljanje njenih temeljnih zadataka. To su: Ured LAG-a (LAG administratori), Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

6.1. Ured LAG-a 5

LAG 5 djeluje na međusobno prometno slabo povezanom području otoka Korčule, Mljeta, Lastova i poluotoka Pelješca, stoga je pored sjedišta nužno uspostavljanje podružnica i dislociranih ureda. Sjedište LAG-a 5 nalazi se na adresi Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula, a podružnica na adresi Potomje 21, 20244 Potomje. Rad s korisnicima organiziran je na način da se pokrije djelovanje na svim područjima, i to u uredu Korčula, podružnica Potomje tri puta tjedno, općina Vela Luka dva puta mjesečno, općine Blato, Smokvica, Orebić, Ston, Mljet jedan put mjesečno te u općini Lastovo kvartalno.

Ured LAG 5-a je 2017. godine imao je ukupno 2 zaposlenika na puno radno vrijeme na poslovima provedbe LRS. U 2018. godini broj zaposlenika je rastao budući da je započeo proces aktivacije tipova operacija od strane Upravljačkog tijela, a time i povećan opseg posla u području provedbe LRS, te je dodatno zaposlena jedna osoba na nepuno radno vrijeme. Kroz 2019. i 2020. godinu ukupan broj zaposlenih u LAG-u 5 bio je 40, odnosno 39 od kojih su njih 4 bile zaposlenice Ureda LAG-a 5, a ostalo predstavlja broj zaposlenih u LAG-u 5 na provedbi projekta „Želim pomagati

Tablica 12. Ljudski kapaciteti Ureda LAG-a 5 u razdoblju 2017. – 2020. godine

Godina	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupan broj zaposlenih	4	5	40*	39*
Broj zaposlenih na puno radno vrijeme	4	4	40	4

Broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme	0	1	0	0
Broj zaposlenih na provedbi LRS	2	3	1	2
Broj zaposlenih na ostalim radnim zadacima	2	1	39	37

*Ukupan broj zaposlenih se odnosi na 4 zaposlenice Ureda LAG-a 5, a ostalo predstavlja broj zaposlenih u LAG-u 5 na provedbi projekta „Želim pomagati“

6.2. Upravni odbor

Struktura i sastav članova Upravnog odbora jedan je od kriterija odabira i bodovanja odabranog LAG-a, prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.1. i 19.2. u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ (NN 43/15). Upravni odbor izvršno je tijelo LAG-a koje sudjeluje u svim fazama provedbe LAG natječaja i odabira projekta, a prvenstveno u:

1. Donošenju internih akata i procedura vezanih uz postupak odabira projekata,
2. Izradi i usvajanju LAG Natječaja i njegovih izmjena, uključujući pripadajuće priloge, obrasce te kontrolne mehanizme, te
3. Donošenju Odluka o odabiru projekata.

Trenutno Upravni odbor broji 13 redovnih članova. Šest članova dolazi iz gospodarskog, četiri iz civilnog, a tri iz javnog sektora. Navedenom strukturom postiže se da niti jedan sektor nema više od 49 % glasačkih prava. Svaki sektor, osim redovnih članova Upravnog odbora ima i po jednog zamjenskog člana koji se aktivira u slučaju utvrđenog sukoba interesa u postupku odabira projekta na natječajima LAG-a 5.

U tablici u nastavku su iskazane evidentirane promjene u Upravnom odboru za koje je podnesen Zahtjev za promjenu u odnosu na podatke temeljem kojih je LAG odabran te sklopljen Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u, prema kojoj je vidljivo da nije došlo do promjene u strukturi članova Upravnog odbora te je LAG 5 kontinuirano ispunjavao uvjete prihvatljivosti temeljem kojih je odabran.

Tablica 13. Promjene Upravnog odbora LAG-a 5

R. B.	Datum donošenja odluke od strane tijela LAG-a	Datum podnošenja zahtjeva za odobrenje promjene	Datum donošenja odluke o odobrenju promjene	Vrsta promjene
1.	20.12.2017.	27.12.2017.	23.01.2018.	Imenovanje zamjenskih članova UO
2.	22.04.2018.	02.05.2018.	14.05.2018.	Promjena člana UO
3.	18.12.2019.	18.12.2019.	06.02.2020.	Promjena članova UO
4.	21.12.2020.	23.12.2020.	-	Promjena člana UO

Prema Statutu udruge, Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. te LRS, Upravni odbor LAG-a 5, kao izvršno tijelo LAG-a, sudjelovao je u svim fazama provedbe do sada raspisanih LAG natječaja i odabiru projekta na LAG razini, što je ujedno vidljivo iz tablice u prilogu 5 koja iznosi popis održanih sjednica UO-a te glavnih odluka i aktivnosti.

6.3. Skupština

Skupština LAG-a 5 najviše je tijelo odlučivanja. U kontekstu provedbe LRS osnovne ovlasti Skupštine su: 1. Imenovanje članova i predstavnika članova tijela LAG-a, 2. Usvajanje LRS i izmjena LRS te Plana provedbe LRS, te 3. Usvajanje Izvještaja o radu i planova rada. U prosincu 2020. godine Skupština LAG-a 5 brojila je 95 člana od toga 27 predstavnika civilnog sektora, 50 gospodarskog i 18 javnog sektora.

6.4. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor broji 5 članova, po jednog predstavnika gospodarskog i civilnog sektora, te tri člana iz javnog sektora. Sukladno Statutu LAG-a 5, Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge, a prema LRS nadležno je tijelo za prigovore za odlučivanje o odabiru projekata u sustavu prigovora na odluke Upravnog odbora. U razdoblju dosadašnje provedbe LRS nije bilo prigovora na odluke o odabiru projekata UO-a, stoga u ovom kontekstu nije bilo potrebe za njihovim zasjedanjem.

7. Vanjsko okruženje

Provedba Mjere 19., a samim time i provedba LRS LAG-ova u Hrvatskoj, regulirana je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. te nacionalnim pravilnicima koji reguliraju provedbu mjera Programa ruralnog razvoja. U tablici je iskazan popis Pravilnika za provedbu Mjere 19., odnosno pripadajućih podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. i njihovih izmjena.

Tablica 14. Popis pravilnika za provedbu Mjere 19. PRR-a

Naziv pravilnika	Oznaka	Datum objave
Pravilnik o Provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.	NN 47/16	10. 5. 2016.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER	NN 108/2016	23. 11. 2016.

(CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.		
Pravilnik o provedbi podmjere 19.2.”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)	NN 96/2017	27. 9. 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«	NN 53/2018	8. 6. 2018.
Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.	NN 91/2019	24. 9. 2019.

Nadalje, osim spomenutog Pravilnika, u kreiranju internih procedura postupka odabira, LAG 5 obvezan je voditi se smjernicama APPRRR-a. U tablicu su iskazane verzije objavljenih smjernica.

Tablica 15. Popis smjernica za postupak odabira projekta LAG-ova

Naziv dokumenta	Datum objave dokumenta
Smjernice za provedbu postupka odabira projekta V1.0.	31. 1. 2018.
Smjernice za provedbu postupka odabira projekta V 1.1.	10. 10. 2019.

Sukladno regulatornom okviru natječaj je na razini LAG-a moguće objaviti nakon aktivacije TO od strane APPRRR-a. U predstojećoj tablici je iznesen kronološki pregled aktivacije LAG natječaja i raspisivanja natječaja za provedbu LRS od strane APPRRR. Za podnošenje Zahtjeva za potporu za projekte odabrane na LAG razini i daljnju provedbu odabranih projekata relevantan je i odgovarajući natječaj za provedbu pojedinih tipova operacije putem LRS. Kao što je prethodno spomenuto u poglavlju 2., jedan od glavnih uzroka provedenih izmjena LRS LAG-a 5 je bio nemogućnost provedbe inicijalno odabranih tipova operacija, odnosno neusklađenost aktivacije tipova operacija s inicijalnim akcijskim planom. Iz tablice 17. je također vidljivo da čak pet tipova operacija koje je LAG 5 inicijalno odabrao za provedbu, u ovom evaluacijskom razdoblju nisu aktivirani od strane APPRRR-a.

Tablica 16. Popis tipova operacija aktiviranih od strane APPRRR-a

TO (PRR)	TO (LRS)	Datum aktiviranja LAG natječaja od strane APPRRR-a	Datum objave natječaja za provedbu operacija putem LRS od strane APPRRR-a
6.3.1.	1.1.4.	9. 2. 2018.	3. 8. 2018.
7.4.1.	3.1.1.	29. 6. 2018.	20. 2. 2019.
4.2.1.	1.1.2.	5. 12. 2018.	2. 10. 2019.
4.1.1.	1.1.1.	1. 2. 2019.	4. 10. 2019.
6.4.1.	2.1.2.	04.11.2020.	20.11.2020.

8.5.2.	2.1.3.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
3.1.1.	1.1.3.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
4.1.3.	2.2.1.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
4.4.1.	3.1.2.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
16.4.1.	1.2.1.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
3.2.1.	1.2.1.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
6.2.1.	2.1.1.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju


8. Analiza rizika i provedenih aktivnosti za ublažavanje

U prilogu broj 7 LRS, iznesena je analiza rizika i mjera za njihovo ublažavanje u provedbi LRS LAG-a 5. U Prilogu 3 su iznesene provedene preventivne aktivnosti s ciljem ublažavanja prepoznatih rizika u trenutku pisanja/izmjena LRS. LAG 5 je u dosadašnjem djelovanju prepoznao sve potencijalne rizike te predviđenim preventivnim aktivnostima djelovao prema njihovom ublažavanju.

9. Dodana vrijednost provedbe LRS LAG-a 5

U među-evaluacijskom razdoblju LAG 5 sudjeluje kao nositelj, projektni partner, koordinator ili pridruženi partner na 10 projekata financiranih izvan mjere 19 PRR-a, što dodatno doprinosi uspješnosti provedbe LRS i dostizanju njenih ciljeva, jačanju kapaciteta LAG-a i njegovih dionika i ciljnih skupina, umrežavanju područja LAG-a te stvaranju partnerstava unutar i izvan LAG područja, međusektorskoj suradnji te pozicioniranju LAG-a kao utjecajnog nositelja lokalnog razvoja na obuhvatnom LAG području. U Prilogu 3 je naveden pregled projekata u kojima je LAG 5 sudjelovao, dok je u nastavku naveden okvirni opis i rezultati svakog projekta.

LAG 5 na projektu HNV link djeluje kao partner i nacionalni koordinator. Područje provedbe projekta u RH je obuhvatni prostor LAG-a 5, Škoji i Brač. Cilj projekta je razvoj poljoprivrednog lanca inovacija jačanjem mladih poljoprivrednika te smanjenjem depopulacije edukacijom, razvojem uske i kontinuirane suradnje svih dionika na područjima velike prirodne vrijednosti te razmjenom znanja i iskustava kroz primjere dobre i loše prakse. Projekt se provodi u 10 „područja učenja“, za koja je karakteristična poljoprivreda visoke vrijednosti te u kojima se poduzimaju inovativne aktivnosti s ciljem održivog razvoja danog poljoprivrednog područja. U sklopu provedbe projekta izrađena je osnovna analiza stanja korištenja poljoprivrednih površina na području LAG-a 5, LAG Brač i LAG-a Škoji odnosno područja učenja Dalmatinski otoci (www.hnmlink.eu). Organiziran je terenski rad studenata sa specijalističkog magistarskog studija AgroParisTech koji su izradili stratešku analizu upravljanja okolišem na području Mljeta, Pelješca i Korčule. Organiziran je niz sastanaka, radionica i konferencija te su članovi i djelatnici LAG-a 5 sudjelovali na studijskom putovanju u Rumunjsku, a sve s ciljem upoznavanja primjera dobre




prakse lanca inovacija u ovom području, učenja te razmjene znanja. Izrađen je Atlas inovacija te niz znanstvenih i stručnih radova.

Projekt PRISMI financiran je iz INTERREG MED programa, a LAG 5 je pridruženi partner Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je izrada platforme kroz koju će se potaknuti rješavanje energetske probleme koji karakteriziraju mediteranske otoke, a odnose na troškove, sigurnost te upravljanje potrošnjom energije. Kroz projekt LAG 5 je na svom području okupio zainteresirane dionike u zajednicu koja će u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje podržati tranziciju LAG 5 otoka prema neovisnim, čistim, sigurnim energetskim sustavima s niskom emisijom ugljika kroz razvoj integriranog transnacionalnog pristupa za procjenu potencijala i iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

LAG 5 sudjeluje kao partner na projektu Bloutoursystem – platforma znanja, vještina i kreativne suradnje za razvoj ekosustava plavog turizma, financiranom iz programa INTERREG IT-HR. Cilj je doprinijeti unaprjeđenju okvira za održivi rast Plavog turizma u skladu sa sektorskim politikama Europske unije i EUSAIR strategije. Specifični ciljevi projekta su razvoj naprednih informacijskih usluga i alata za korištenje tržišnih informacija, te poboljšanje vještina i kapaciteta dionika turizma, kako bi se unaprijedio okvir za razvoj prekograničnih turističkih mreža i ekosistema plavog gospodarstva. U sklopu provedbe projekta održane su radionice za dionike u turističkom sektoru, uključujući i predstavnike lokalne samouprave, udruge te obrazovne institucije. Cilj radionica bio je unapređenje znanja i vještina dionika u korištenju digitalnih oblika komuniciranja, destinacijskom menadžmentu, profesionalizaciji pružatelja usluga i kvalitete turističkog proizvoda kao pretpostavki razvoja održivog turizma.

Nositelj projekta Želim pomagati, financiranog iz ESF-a je LAG 5, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik; Centar za socijalnu skrb Korčula; Općina Vela Luka; Općina Smokvica, Grad Korčula i Općina Orebić. Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Nositelj projekta „Uči dalje!“ je udruga Novi otok, partneri su LAG 5 i Sveučilište u Dubrovniku. Cilj projekta je educiranje 42 mlade osobe (do 29 godina života) koje aktivno traže posao kako bi usvojili nova znanja i vještine za razvoj svojih poduzetničkih ideja. Realizirat će se kroz niz dvodnevnih edukativnih radionica na temu organizacije kulturnog događaja, inovativnih metoda organizacije događaja i poduzetništva u kulturi. Polaznici će naučiti kako osmišljavati i realizirati projektne ideje, izraditi poslovni plan uz mentorsku podršku za start up fazu poslovanja, te osnove projektnog financiranja iz nacionalnih i EU fondova. Kroz jednodnevne kreativne




radionice dizajniranja motiva i logotipa, osnova tehnika krojenja, oslikavanja stakla i keramike, decoupage tehnike, rezbarenja drva, te izrade nakita, osmišljavat će inovativna dizajnerska rješenja bazirana na lokalnim motivima i njihovu primjenu u različitim tehnikama i medijima. Radionica osnova izrade web i mobilnih aplikacija imat će za zadatak izradu jednostavne aplikacije kulturnog portala otoka Korčule. Sveukupno će se organizirati 13 radionica, 5 dvodnevni i 8 jednodnevni, za 10 ili 20 polaznika, ovisno o tipu radionice.

LAG 5, uz udrugu Novi otok, partner je na projektu Oblak znanja za otok mogućnosti, financiranog iz ESF-a, dok je nositelj Katus d.o.o. Cilj ovoga projekta je educiranje 41 nezaposlene osobe, pripadnika ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih kompetencija te uključivanju učenika korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za njihovo profesionalno usmjeravanje. Provedba projekta uključuje organiziranje programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja za jednostavne poslove trenutno najtraženijih zanimanja: kuhar (16 osoba), slastičar (7 osoba), njegovatelj starijih i nemoćnih (4 osobe), recepcioner (7 osoba) i sobar (7 osoba). Projektom je također predviđeno uključivanje 30 srednjoškolaca radi rane intervencije i profesionalnog usmjeravanja prilagođenog stvarnom stanju na tržištu, s namjerom njihove kvalitetne pripreme za skori ulazak na tržište rada. U školama će se organizirati 5 fokus grupa za po 6 učenika sa svrhom utvrđivanja interesa i razine informiranosti o tržišno vrijednim kompetencijama.

Nositelj projekta WEB 'N' WORK, financiranog iz ESF-a je Udruga Deša, a LAG 5 je partner. Cilj projekta je uspostaviti e-learning platformu na kojoj će nezaposlene žene i mladi moli kontinuirano pregledavati edukacijske materijale, on-line tečajeve, videa, prezentacije i dokumente koji će im pomoći pri usvajanju novih znanja i vještina u svrhu samozapošljavanja i jačanja kompetencija na tržištu rada. U sklopu projekta na LAG području je održan niz radionica.

LAG 5 sudjeluje kao projektni partner na projektu „Rural 3.0. Društveno korisno učenje u službi ruralnog razvoja“. Cilj ovog projekta je postaviti okvir za integrirani transnacionalni pristup akademskoj nastavi koja doprinosi razvoju ruralnih područja, odgovarajući na njihove potrebe, a ujedno i potičući inovacije u tim područjima. Pojednostavljeno, cilj je stvaranje partnerstva između ruralnih zajednica i Sveučilišta kako bi studenti na završnim godinama studija ponudili svoje znanje i vještine ruralnoj zajednici, a zauzvrat dobili praktično iskustvo i mogućnost usavršavanja. Kako bismo ostvarili partnerstvo između ruralnih zajednica i Sveučilišta namjeravamo izgraditi bazu podataka u kojoj se ruralni partneri i ustanove visokog obrazovanja mogu međusobno pronaći i ostvariti suradnju. Svi koji se pridruže platformi imat će mogućnost pronalaska partnera i besplatan pristup programima osposobljavanja te otvorenim obrazovnim resursima za ruralno društveno korisno učenje i ruralno društveno poduzetništvo (MOOC, Hub, Online World Cafe, itd.).



LAG 5 je pridruženi partner na projektu RUR'UP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj perifernih ruralnih područja. Partnerstvo i projektna prijava se temelji na rezultatima provedenog projekta HNV – link (HORIZON 2020), tijekom kojeg su utvrđena dva temeljna problema na polju visokog obrazovanja čije će rješavanje biti u fokusu: stvaranje interdisciplinarnih kurikuluma obrazovanja baziranih na razumijevanju i razvoju inovacija te razvoj vještina ključnih dionika/ciljnih grupa nositelja održivog ruralnog razvoja. Ciljevi projekta: steći bolje razumijevanje potreba izoliranih ruralnih područja kako bi omogućili studentima stjecanje odgovarajućih znanja i vještina kojima će moći odgovoriti zahtjevima tržišta rada i potrebama regija; podržati razvoj odgovarajućih kurikuluma; ojačati suradnju između institucija visokog obrazovanja i poslodavaca, poboljšati profesionalne kompetencije institucija visokog obrazovanja. Projektna aktivnosti su usmjerene na razvoj, testiranje i implementaciju kolegija ruralnog razvoja, a uključuju transdisciplinarnu razmjenu znanja i iskustava akademskih i neakademskih dionika te korištenje otvorenih izvora učenja. Uloga LAG-a 5 kao pridruženog partnera je olakšati koordinaciju i suradnju akademskih i neakademskih dionika; suradnja sa Sveučilištem u Osijeku u izradi procjene potreba trenutnih kurikuluma visokog obrazovanja iz područja ruralnog razvoja te u sudjelovanje u diseminaciji i kapitalizaciji projektnih rezultata.

LAG 5 je prijavitelj projekta „Obrazovanje odraslih za održivu kulturu“/ "Adult education for a sustainable culture". U sklopu projekta predviđen je studijski posjet članova organizacija iz Hrvatske - LAG 5, Meraki, Brodoto i Permakultura Dalmacija, španjolskoj organizaciji Permacultura Cantabria te osmodnevni trening u mjestu Ramales de la Victoria o izradi održivih projekata u skladu s principima permakulture. Edukacija je namijenjena odraslim osobama u svrhu stjecanja novih znanja i vještina iz domene zaštite okoliša, koja će se kroz različite aktivnosti integrirati u matičnim organizacijama i prenositi u lokalnim sredinama.


LAG 5 je u 2019. organizirao LAG 5 fest, sufinancirano sredstvima DNŽ. Ovoj je jednodnevna eno-gastro manifestacija, s ciljem što boljeg povezivanja lokalnih proizvođača, razmjene iskustava te brendiranja autohtonih lokalnih proizvoda. U 2020 nije održan zbog epidemiološke situacije.

10. Evaluacijska pitanja

1. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 odgovorila na identificirane razvojne potrebe LRS?

Analiza razvojnih potreba u LRS LAG-a 5 provedena je u sklopu analize stanja, izdvojivši prema svakom poglavlju, tj. tematskoj cjelini (kulturna i povijesna baština, prirodna baština, infrastruktura, poduzetništvo, poljoprivreda, turizam, tržište radne snage, stanovništvo, školstvo i kultura) po nekoliko ključnih prepoznatih razvojnih potreba.

Uvidom u inicijalno odabrane tipove operacija LRS, može se ustanoviti kako isti u potpunosti odgovaraju na prepoznate razvojne potrebe u LRS, međutim izmjenama LRS i izostavljanjem



pojedinih tipova operacija, ujedno i prioriternih mjera, zbog objektivnih i vanjskih prilika, razvojne potrebe će tek djelomično biti uvažene. Naime, provedbom preostalih tipova operacija LRS, neće se ili će se tek djelomično odgovoriti na razvojne potrebe iz poglavlja prirodne i kulturne baštine, školstva i kulture, određenih aspekata infrastrukture i sl.

Nadalje, razvojne potrebe prostora LAG-a 5 prepoznate u LRS, osim kroz provedbu LRS, prepoznate su i uvažavaju se kroz aktivnosti i projekte financirane izvan mjere 19, u kojima je LAG 5 sudjelovao kao partner, koordinator ili nositelj. Ovi su projekti i pojedinačne aktivnosti značajno doprinijeli uvažavanju razvojnih potreba područja LAG-a 5 prema opisanim potrebama u LRS.

2. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 prepoznala razvojne potencijale navedene u LRS?

LRS LAG-a 5 kao razvojne potencijale navodi:


- prirodni uvjeti i resursi, očuvana priroda i okoliš,
- tradicija i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji i postignuta konkurentnost i tržišna orijentiranost za neke proizvode,
- razvijenost turizma, rastući interes i potražnje za novim sadržajima i oblicima turizma
- društveni kapital lokalnih zajednica, aktivnosti civilnog društva, očuvanje i njegovanje identiteta, kulturna baština,
- djelovanje LAG-a 5 i suradnja s drugim nositeljima razvoja

Uvidom u inicijalno odabrane tipove operacija LRS može se ustanoviti kako isti u potpunosti prepoznaju navedene razvojne potencijale, te se isti planiraju valorizirati provedbom tipova operacija LRS. Međutim, provedenim izmjenama LRS, ovi razvojni potencijali će se valorizirati tek djelomično, a posebice će izostati valorizacija prirodne i kulturne baštine. Važno je napomenuti kako je LAG 5 uložio dodatne napore te sudjelovanjem u projektima i aktivnostima financiranima iz drugih izvora, nastoji uvažiti prepoznate razvojne potencijale, pa je tako sudjelovao u projektima razvoja održivog turizma, očuvanja i održivog valoriziranja prirodnih resursa, unapređenja društvenog kapitala lokalne zajednice, promicanju i obogaćenju aktivnosti civilnog društva te uspostave i promicanje suradnje LAG-a 5 s drugim razvojnim dionicima.

3. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 ostvarila viziju navedenu u LRS?

Vizija LRS LAG-a 5 glasi:

LAG 5 zajednica je s konkurentnom poljoprivredom i čitavim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja i atraktivnom očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju.



Ostvarenje vizije planirano je provedbom ukupno 14 tipova operacija, distribuiranih u 6 prioriternih mjera i 3 strateška cilja iz odobrene LRS, međutim kroz provedeno jedno usklađenje i 3 izmjene LRS, ostala su 4 tipa operacija za postizanje vizije. Vizija navedena u ovakvom izričaju naglašava konkurentnost poljoprivrede, kvalitetu življenja, očuvanu prirodnu i kulturnu baštinu te tradicijske vrijednosti, a iz navedenih odrednica slijedi logično postavljeni strateški okvir LRS, tj. odabir strateških ciljeva, prioriternih mjera i tipova operacija.

Od odrednica navedenih u viziji LRS, konkurentnost poljoprivrede ostvaruje se kroz strateški cilj 1. Razvoj konkurentne, tržišno orijentirane i održive poljoprivredne proizvodnje te provedbu TO 1.1.1 i 1.1.4 LRS. Kroz raspisane LAG natječeje do sada je na LAG razini odobreno ukupno 19 projekata za TO 1.1.1 i 7 projekata za 1.1.4, a njihovom provedbom značajno će se doprinijeti modernizaciji poslovanja poljoprivrednih gospodarstava te povećanju poljoprivredne proizvodnje. Provedenim izmjenama LRS te odbacivanjem pojedinih tipova operacija i prioriternih mjera, pak izostaje razvoj lokalnih tržišta novih trgovinskih i distribucijskih kanala, koje LAG 5 nastoji provesti organizacijom LAG 5 fest-a.


Nadalje, kvaliteta življenja se ostvaruje kroz strateški cilj 3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5, te provedbom TO 3.1.1., 3.2.1. i 3.2.2. Kroz raspisane LAG natječeje do sada je odobreno ukupno 9 projekata za TO 3.1.1., čijom će se realizacijom značajno unaprijediti lokalna infrastruktura i/ili usluge.

Nemogućnost potpunog ostvarivanja definirane vizije kroz provedbu LRS dolazi do izražaja nakon provedenih izmjena, odnosno izostanka pojedinih tipova operacija, posebice u pogledu aspekta očuvanja prirodne i kulturne baštine te tradicijske vrijednosti. Unatoč nemogućnosti potpunog ostvarivanja navedene vizije kroz prioritne mjere i strateške ciljeve LRS, potrebno je napomenuti kako LAG 5 viziju navedenu i inicijalno odabranom LRS nastoji ostvariti sudjelovanjem u ostalim projektima i aktivnostima, čija tematika, postavljeni ciljevi i aktivnosti značajno doprinose ostvarenju vizije.

4. Na koji se način dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 vodila ciljevima primjene LEADER pristupa u RH?

- Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva

LAG 5 je kroz dosadašnju provedbu LRS promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva ostvario kroz pokretanje i provedbu projekta suradnje „Bee friends“ na tematiku pčelarstva s LAG-om Moslavina te poljskim LAG-ovima Ziemia Pszczyńska i Żywiecki Raj, te kroz inicijalnu pripremu projekta suradnje „DalmaTIMskim otocima, s otočnim LAG-ovima Brač i Škoji. Osim navedenog, LAG 5 je kroz dosadašnje sudjelovanje u provedbi ukupno 10 projekata financiranih izvan M19, sudjelovao u uspostavi lokalnih multisektorskih inicijativa i partnerstva



na području obuhvata LAG-a 5, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i onih međunarodnog karaktera.

- **Unapređenje i promicanje politike ruralnog razvoja;**

Tri opća prioriteta za politiku ruralnog razvoja uključuju poticanje konkurentnosti u poljoprivredi, održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanja protiv klimatskih promjena te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. Navedeni prioriteti politike ruralnog razvoja su kroz dosadašnju provedbu LRS LAG-a 5 promicani financiranjem projekata iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, sudjelovanjem LAG-a u aktivnostima i projektima koji djeluju protiv klimatskih promjena te potiču ekologiju i održivo upravljanje resursima, kao što su projekti HNV Link, PRISMI i Blutoursystem.


Poseban aspekt unapređenju i promicanju politike ruralnog razvoja, LAG 5 donosi sudjelovanjem u projektu Rural 3.0. Društveno korisno učenje u službi ruralnog razvoja, čiji je osnovni cilj stvaranje partnerstva između ruralnih zajednica i Sveučilišta kako bi studenti ponudili svoje znanje i vještine ruralnoj zajednici, a zauzvrat dobili praktično iskustvo i mogućnost usavršavanja, kao i sudjelovanjem u projektu RUR'UP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj perifernih ruralnih područja, čiji je cilj stvaranje interdisciplinarnih kurikuluma obrazovanja baziranih na razumijevanju i razvoju inovacija te razvoj vještina ključnih dionika/ciljnih grupa nositelja održivog ruralnog razvoja.

- **Podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja;**

Navedeno LEADER načelo se u dosadašnjoj provedbi LRS LAG-a 5 u najvećoj mjeri ostvarivalo kroz participativne radionice i sudjelovanje javnosti u procesu izrade LRS, te animacijske aktivnosti u organizaciji LAG-a 5 koje su održavane s ciljem informiranja potencijalnih korisnika LAG natječaja.

- **Povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva**

Informiranost i educiranost ruralnog stanovništva LAG-a 5 se u dosadašnjoj provedbi LRS provodila kroz animacijske i informacijske aktivnosti LAG-a. Informiranost se dodatno postizala redovitim medijskim objavama od strane ureda LAG-a 5 o temama relevantnim za poljoprivredu, ruralni razvoj i općenito lokalnu zajednicu, ali i o tijeku provedbe LRS te raspisivanju LAG natječaja. Medijske objave su obuhvaćale društvene mreže LAG-a 5 (putem *facebook* objava), službenu internetsku stranicu LAG-a, službene internetske stranice jedinica lokalne samouprave u sastavu LAG-a, novinske objave te lokalne i regionalne radio postaje. Edukacije i informiranost lokalnog stanovništva su se dodatno provodile prema specifičnim temama u sklopu ostalih



aktivnosti i projekata u kojima je LAG sudjelovao ili bio partner, kao što su provođenje edukacija za poduzetništvo te stjecanje tržišno potrebnih kompetencija.

- **Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući i dobrobit**

Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta se kroz dosadašnju provedbu LRS LAG-a 5 postiže provedbom projekata financiranih iz natječaja za tip operacije 3.1.1., tj. ulaganjima u malu komunalnu i/ili društvenu i/ili javnu infrastrukturu. Do sada je LAG 5 izdao Odluku o odabiru 10 9 projekata iz ovog tipa operacije (1 korisnik je odustao od daljnje provedbe), a odnose se na ulaganja u malu ruralnu infrastrukturu poput rekonstrukcije, građenja i opremanja komunalne infrastrukture (groblja, stubišta, dječja igrališta) te opremanja dječjih vrtića i domova kulture.

- **Stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade**

Dosadašnje djelovanje LAG-a 5 je doprinijelo stvaranju novih, održivih mogućnosti zarade informiranjem lokalnog stanovništva o raspisanim LAG natjecajima, te također kroz sudjelovanje LAG-a 5 kao projektnog partnera ili nositelja na projektima jačanja poduzetništva, stvaranja i razrade poduzetničkih ideja i projekata, jačanja poduzetničkih kompetencija kod ciljnih skupina, zatim mentoriranja u izradi poslovnih planova, edukacijama o mogućnostima financiranja projektnih ideja i sl., kroz koje će se stvoriti neophodni preduvjeti za nova zapošljavanja i samozapošljavanja te mogućnosti za stvaranje prihoda.


- **Očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta**

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela očuvanju i stvaranju ukupno 2 radna mjesta vezano uz provedbu SC 3 LRS, dok se dodatna 2 nova radna mjesta očekuju provedbom SC2 LRS do kraja 2023. godine.

Učinak dosadašnjeg djelovanja LAG-a 5 na stvaranje radnih mjesta je intenzivniji kroz provedbu projekata i aktivnosti financiranih izvan mjere 19. Tako je tijekom 2019. i 2020. godine u LAG-u 5 na provedbi projekta „Želim pomagati“ bilo zaposleno 39 osoba. Doprinos zapošljavanju vidljiv je i kroz projekt Oblak znanja za otok mogućnosti, putem kojeg će se educirati i prekvalificirati 41 nezaposlena osoba, čime će se doprinijeti njihovom zapošljavanju. Neposredan doprinos stvaranju novih radnih mjesta vidljiv je sudjelovanjem u projektima i aktivnostima stjecanja novih znanja i vještina te jačanju poduzetničkih i drugih specifičnih kompetencija različitih ciljnih skupina, čime će se dodatno doprinijeti jačanju i razvoju poduzetništva, a time i novih radnih mjesta.

- **Diversifikacija gospodarskih aktivnosti**

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti tek djelomično, prvenstveno zbog objektivnih okolnosti i smanjenih mogućnosti ulaganja u druge



gospodarske sektore, osim primarno poljoprivrede. Diverzificiranost gospodarskih aktivnosti će se postići ostvarivanjem strateškog cilja 2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti, odnosno provedbom projekata u sklopu TO 2.1.2. u narednom periodu.

5. U kojoj mjeri i na koje načine je dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 doprinijela:

- **Inovacijama**

Inovacijama se u dosadašnjem razdoblju pridonijelo sudjelovanjem LAG-a 5 u provedbi projekata HNV-LINK: Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: učenje, znanost i inovacije, kroz ostvarivanje glavnog cilja projekta, tj. razvoja poljoprivrednog lanca inovacija. Kako bi se osigurala podrška svih sektora očuvanju i revitalizaciji poljoprivrede visoke vrijednosti mozaičnih krajobrazu, karakterističnim za krška područja dalmatinskih otoka, detektirani su slijedeći inovativni pristupi: organizacije koje okupljaju dionike različitih sektora kao posrednici u znanju i katalizatori za provedbu vrijednosti HNV-a u lokalnim zajednicama, Agroturizam koji koristi HNV pristup kao dio turističkog iskustva, revitalizacija suhozida, rasadnik autohtonih vrsta.

U sklopu projekta BLUTOURSYSTEM je stvorena Bloutoursystem platforma te je potpisan ugovor o suradnji kojim je uspostavljen model upravljanja za inovacije u Plavom turizmu. Zainteresirani dionici na platformi mogu pronaći smjernice za implementaciju inovacijskih procesa i rješenja specifičnih za konkretnu destinaciju (npr. difuzni hoteli). Dostupan im je i informacijski sustav koji pruža uvid u najkritičnije točke vezane za održivost, dostupnost i inovativnost destinacije, što će im olakšati razumijevanje trendova u turizmu i procjenu njihovog ekonomskog učinka.

U Natječaju za TO 2.1.2. inovativnost projekta je jedan od uvjeta kojim je moguće povećati propisani intenzitet potpore od 70 % za dodatnih 20 %.

- **Zaštiti okoliša i klimatskim promjenama**

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela zaštiti okoliša i klimatskim promjenama kroz poticanje ekološke poljoprivrede te ulaganja unutar zaštićenih područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, koji su uključeni u kriterije odabira predmetnih natječaja.

Osim kroz provedbu LRS, LAG 5 je posebice pridonio zaštiti okoliša i klimatskim promjenama sudjelovanjem u ostalim aktivnostima i projektima, među kojima se ističu tri projekta čije aktivnosti izravno doprinose ovom općem cilju: HNV-LINK: Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: učenje, znanost i inovacije, PRISMI - Promoviranje integracije OIE za pametne mediteranske otoke. U sklopu programa „SMILO Lastovo“, u suradnji s JU PP Lastovsko otočje je izrađena osnovna analiza potreba za održivim razvojem otoka Lastova kao i strateški projektni prijedlozi u domeni ekonomskog razvoja.



- **Integraciji i umrežavanju područja LAG-a**

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela integraciji i umrežavanju područja LAG-a kroz provedbu projekta suradnje iz podmjere 19.3. i projekata financiranih iz drugih izvora u kojima LAG 5 sudjeluje. LAG 5 od svog osnutka pruža savjetodavnu pomoć brojnim udrugama (primjerice Pelješka dica, Mala sirena, Novi otok, KU Ivo Lozica, Moreška – Korčula, Ronilački klub, Slow food, Korčulanske pjatance) s područja obuhvata, prvenstveno prilikom prijave natječaja, a u istom smislu ostvaruje i partnerske odnose. Izazov postizanju integracije i umrežavanja područja LAG-a 5 predstavlja činjenica kako se LAG sastoji od prometno slabije povezanih otoka i područja, pa je u budućnosti potrebno staviti naglasak na njihovu prometnu, društvenu i gospodarsku integraciju. Unapređenje integracije i umrežavanja područja LAG-a moguće je u budućnosti unaprijediti uvođenjem kriterija odabira koji uvažavaju i uvjetuju provedbu aktivnosti na više JLS/otoka LAG-a ili dionika s više JLS/otoka LAG-a 5.

- **Promicanju interesa ciljanih skupina LAG-a**

Prema Statutu LAG-a 5 ciljane skupine obuhvaćaju široki i šaroliki spektar lokalnih aktera i dionika, pojedinaca i interesnih skupina kao što su: djeca, mladi, osobe starije životne dobi, lokalna i regionalna samouprava, poljoprivrednici i ribari, poslovne organizacije, mali i srednji poduzetnici, žene i žene poduzetnice, ruralno stanovništvo, odgojno-obrazovne ustanove, potrošači, udruge i građanske inicijative, osobe u riziku od siromaštva, volonteri i dr. Sukladno osnovnoj ulozi i dosadašnjim mogućnostima, LAG 5 je putem provedbe LRS i podmjere 19.2. u najvećoj mjeri promicao interese poljoprivrednika, malih i srednjih poduzetnika u poljoprivredi, ruralnog stanovništva te lokalne samouprave, s obzirom da je najveći broj prihvatljivih korisnika na LAG natjecajima potencijalno mogao biti iz ovih interesnih skupina. Iako se kao organizacija, osim javnog i privatnog sektora, LAG-ovi sastoje i od predstavnika civilnog sektora, te ujedno promiču njihove interese, u ovom je provedbenom razdoblju do sada je najmanji broj projektnih prijava bio iz civilnoga sektora, međutim značajnije su bili uključeni kroz aktivnosti i projekte financirane iz drugih izvora. Osim navedenoga, tematika, aktivnosti i ciljevi projekata financiranih iz drugih izvora u kojima LAG 5 sudjeluje kao nositelj, koordinator, ili partner uvelike promiče interese ciljanih skupina navedenih u Statutu udruge.

11. Zaključci s preporukama

Prema rezultatima evaluacije provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2020. godina te rada LAG-a 5 mogu se donijeti slijedeći zaključci s preporukama:

1. LAG 5 je do sada adekvatno i prema odredbama relevantnog Upravljačkog tijela, a istodobno uvažavajući lokalne potrebe i potencijale, izvršavao jedan od svojih temeljnih zadataka provedbe LRS. Ovome su u najvećoj mjeri doprinijeli slijedeći čimbenici: informirana i educirana stručna služba LAG-a, provođenje dovoljnog broja animacijskih i informacijskih aktivnosti prema krajnjim korisnicima i tijelima LAG-a koji su ujedno bili adekvatno prostorno distribuirani, promidžba LAG-a 5, te kontinuirana komunikacija i analiza potreba krajnjih korisnika koja je omogućila pravovremene intervencije u izmjenama LRS, kako bi se u konačnici omogućila njena učinkovita i efikasna provedba. U daljnjoj provedbi preporuka je nastaviti pratiti preporuke i sudjelovati u radu Upravljačkog tijela i drugih relevantnih LEADER/CLLD organizacija, te kontinuirano pratiti potrebe i potencijale lokalnih dionika i potencijalnih krajnjih korisnika.

2. Kvantitativni pokazatelji i ciljevi u LRS su djelomično postignuti u skladu s inicijalnim očekivanjima, međutim tome su uvelike pridonijeli vanjski čimbenici, kao što su kašnjenja u provedbi podmjere 19.2, dinamika aktivacije tipova operacije od strane Upravljačkog tijela te dinamika provedbe administrativnih procedura od strane APPRRR-a, što nije u nadležnosti LAG-a 5. Ipak, pravovremenim intervencijama u izmjenama LRS, a prema potrebama krajnjih korisnika, LAG 5 je djelovao prema što učinkovitijoj i efikasnijoj provedbi LRS. U daljnjoj provedbi preporuka je putem LEADER/CLLD organizacija, ali i pojedinačnim primjerima i inicijativama nastaviti ukazivati na postojeće nedostatke u sustavu provedbe tzv. LEADER mjere PRR-a te na potencijalne mogućnosti poboljšanja. Također, kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće prijelazno/financijsko razdoblje, preporuka je već sada započeti sa uspostavom internog sustava prikupljanja projektnih ideja, analize stanja i dionika/interesnih skupina/ciljnih skupina LAG-a 5.

3. Osim svoje temeljne uloge provedbe LRS, LAG 5 je u svom dosadašnjem radu adekvatno djelovao prema postizanju općih horizontalnih i razvojnih ciljeva, čime se sve više pozicionira kao važan razvojni dionik prostora kojeg obuhvaća. Posebice se odnosi na aktiviranje ciljnih skupina i prepoznavanje razvojnih prioriteta, provedbom projekata i sudjelovanjem u aktivnostima financiranim izvan mjere 19. U daljnjem djelovanju organizacije preporuka je kontinuirano pratiti potencijale i potrebe dionika i korisnika, uključujući redovito praćenje i ažuriranje projektnih ideja i inicijativa te okupljanje, animiranje, informiranje i educiranje potencijalnih korisnika.

Popis slika i tablica

Slika 1 Prikaz izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5	11
Slika 2 Prikaz izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a 5	12
Slika 3 Prikaz izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5	14
Slika 4 Vrijednost odobrenih projekata prema interesnim sektorima	17
Slika 5 Vrijednost odobrenih projekata prema sjedištu korisnika	18
Tablica 1. Odobreni iznosi LRS LAG-a 5 prema podmjerama prema Ugovoru	7
Tablica 2. Pregled odabranih strateških ciljeva, mjera i tipova operacija LRS LAG-a 5 – VO	8
Tablica 3. Provedene promjene LRS LAG-a 5 tijekom dosadašnje provedbe	10
Tablica 4. Pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5.....	10
Tablica 5. Pregled izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a 5	11
Tablica 6. Pregled izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5.....	13
Tablica 7. Iznos isplaćenih sredstava LAG-a 5 po kvartalima	19
Tablica 8. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 - Aktivnosti za potencijalne korisnike mjera definiranih LRS LAG-a 5 2014. - 2020.	20
Tablica 9. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 - Sudjelovanje članova, zaposlenika i volontera LAG-a 5 na radionicama, sastancima i konferencijama vezanim uz provedbu mjere 19 i LEADER/CLLD pristupa i provedbe LRS u organizaciji drugih pravnih osoba	21
Tablica 10. Pregled ostvarenih indikatora prema strateškim ciljevima do 2020. godine	24
Tablica 11. Pregled planiranih i postignutih pokazatelja isporuka do 31.12.2020. godine za tipove operacije	25
Tablica 12. Ljudski kapaciteti Ureda LAG-a 5 u razdoblju 2017. – 2020. godine	26
Tablica 13. Promjene Upravnog odbora LAG-a 5.....	27
Tablica 14. Popis pravilnika za provedbu Mjere 19. PRR-a	28
Tablica 15. Popis smjernica za postupak odabira projekta LAG-ova	29
Tablica 16. Popis tipova operacija aktiviranih od strane APPRRR-a	29

PRILOG 1 Pregled odabranih i odobrenih projekata na 31.12.2020. godine

R.B.	Naziv projekta	LAG Natječaj	TO	Status 31.12. 2020. godine	Iznos odobrenih sredstava	JLS	Sektor	Opis ulaganja (aktivnosti)	Rezultati ulaganja
1	Sadnja vinograda i modernizacija proizvodnje	1	1.1.4	završen	111,678.00	Općina Ston	Gospodarski	Tresač za masline, pila motorna, leđna prskalica, lozni cijepovi 2200 kom sorte Plavac mali i Maraština /Rukatac, željezni kolci 200 komada, gajbe za prijenos grožđa i maslina, rad na rekonstrukciji vinograda 1400 m2, rad na sadnji novog vinograda 1600 m2, ograđivanje vinograda, zaštita od divljih životinja.	Modernizirana proizvodnja, rekonstruirani stari i posađeni novi vinogradi
2	Ulaganje u uzgoj purana i kokoši te nabavu potrebne opreme na OPG-u Anto Tikvić	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Ston	Gospodarski	Kupnja kokoši nesilica, kupnja 200 purana, izgradnja ograde za živinu, smještaj za kokoši, ograda za živinu -za ispašu purana na otvorenome, smještaj za purane, novi motokultivator za freziranje i pripremu za otvoreni tov, polovna prikolica, trošak konzultanta.	NP
3	Podizanje novih i restrukturiranje starih višegodišnjih nasada	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Smokvica	Gospodarski	Nabava višegodišnjih sadnica: 400 sadnica vinova loza- Pošip, 50 sadnica maslina: 32 Lastovke, 10 Levatinke, 8 Drobnice; 200 artičoka, 24 smokve, 6 bajama, 4 žižule, 3 šljive, 2 marelice, 2 nektarine, 2 trešnje, 2 motokultivatora, motorna kosa, motorna prskalica, motorna pila, autoprikolica, škare 2 kom, pila felco, maslinočist. priprema vinograda za mehaničku obradu (bager); rezanje starih loza, uklanjanje žice, kolaca, pripremanje neobrađenih čestica za mehaničku obradu, sadnja i gnojenje novih nasada, transport gnojiva, gnojivo, bager, traktor, tresać maslina.	NP
4	Podizanje vinograda i modernizacija vinogradarskih tehnologija	1	1.1.4	Završen	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Kupnja poljoprivrednog zemljišta, aku škare s baterijom za rezidbu, kupnja sadnog materijala, kupnja motorne prskalice, izrada poslovnog plana.	Kupljeno poljoprivredno zemljište, sadni materijal te poljoprivredna mehanizacija
5	Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i modernizacija poslovanja	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Rashladni uređaj za hlađenje mošta, poluautomatska punilica za vino, inox tank, poluautomatska etiketirka za boce, drvena bačva za čuvanje vina, inox tank dva komada.	NP

6	Restrukturiranje postojećeg nasada vinove loze	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Kupnja sadnica vinove loze, 4.000 komada, restrukturiranje postojećeg vinograda - vađenje stare loze, rigovanje zemljišta (duboko oranje) i priprema zemljišta za sadnju vinove, gnojivo za meliorativnu gnojidbu restrukturiranog nasada vinove loze, kolci za restrukturirani i postojeći nasad vinove, podizanje zidova oko nasada, visina 1 metar, popravak međa (zidova) oko nasada loze i maslina, konzultantske usluge.	NP
7	Kupnja poljoprivredne opreme za preradu grožđa i proizvodnju vina	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Muljača, pumpa za vino, pumpa za masulj i vino, punilica za vino, filter za vino, čepilica, cijevi za vino raznih promjera i pripadajući DIN priključci, konzultantske usluge.	NP
8	Održavanje i revitalizacija maslinika i nasada vinove loze na otoku Lastovu	1	1.1.4	završen	111,678.00	Općina Lastovo	Gospodarski	Kupnja polovnog traktora, traktorska freza, oprema za dopunsku obradu tla - MK Adria, oprema za regeneraciju, održavanje krošnje stabla masline, teleskopski karbonski nastavak za F3010, električni brusač, specijalni uređaj za rezidbu, berbu voća i povrća, specijalni uređaj za rezidbu, berbu voća i povrća (električni tresać berač maslina), oprema za zaštitu u voćnjacima i vinogradima prskalice motorna, škare za živicu	Nabavljena oprema, održavan i revitaliziran maslinik i nasad vinove loze
9	Povećanje održivosti i modernizacija poljoprivrednog gospodarstva	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Sadnice vinove loze 4400 kom, trimer, prskalice, baterijske škare za rezidbu, gnojivo za sadnju vinove loze, kolci za lozu, tresać za masline, izrada poslovnog plana.	NP
10	Modernizacija opreme i povećanje proizvodnih kapaciteta	1	1.1.4	završen	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Kupnja opreme za izradu uređaja za hlađenje, kupnja baterijskih škara, kupnja Inox spremnika, kupnja sadnica PLAVAC MALI 500 kom i POŠIP 1000 kom, gnojiva za sadnju, čišćenje terena od šume, odvoz raslinja na deponij, rad pikamerom, trapanje zemlje te fino freziranje i priprema za sadnju.	Nabavljena oprema, povećani kapaciteti proizvodnje
11	OPG Andreis Vinko	1	1.1.4	završen	111,678.00	Općina Vela Luka	Gospodarski	Kupnja traktora, kupnja traktorske freze, kupnja traktorskog priključka.	Nabavljena oprema
12	Novi maslinik i nabava poljoprivredne mehanizacije	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Blato	Gospodarski	Rušenje borovih stabala na parceli, vađenje korijenja, obrada površine bagerom, freziranje cijele površine (rušenje i usitnjavanje srušenih stabala, krčenje i obrada bagerom, odvoz iskrčenog grmlja i usitnjenih srušenih stabala, kolci za masline, iskop rupa, pripreme radnje za sadnju 60 stabala sadnica, branje korova, gnojidba, rezidba, kupnja poljoprivredne opreme: pneumatske škare za branje maslina, pneumatska pila	NP

								za masline i lozu, električne škare, bakterijska prskalica, čistilica maslinovog ploda, pneumatski berači maslina, gusjeničar - samohodni kompresor za rad na terenu, operativne aktivnosti.	
13	Proširenje poslovanja OPG-a ulaganjem u kupnju zemljišta	1	1.1.4	završen	111,678.00	Općina Orebić	Gospodarski	Kupnja poljoprivrednog zemljišta.	Kupljeno novo poljoprivredno zemljište
14	Moderniziranje poslovanja ulaganjem u rekonstrukciju objekta i novu opremu	1	1.1.4	u provedbi	111,678.00	Općina Dubrovačko primorje	Gospodarski	Adaptacija i uređenje prostora, novi tresać komplet s karbonskim štapom, nova preša za grožđe, nove škare, dvije inox bačve.	NP
15	Rekonstrukcija groblja sv. Juraj - Podvlaštica	2	3.1.1	u provedbi	296.500,00 kn	Općina Orebić	javni	Žbukanje 200m ² ogradnih armiranobetonskih zidova, postavljanje kamenih poklopnica, popločavanje 225m ² staze prirodnim štokovanim kamenom.	NP
16	Spojno stubište između dvije prometnice u naselju Brna	2	3.1.1	u provedbi	228.822,08 kn	Općina Smokvica	javni	pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, te ostali radovi (postavljanje zaštitne pješačke ograde) – prema troškovniku i glavom projektu; trošak pripreme projektnog prijedloga, trošak vođenja projekta	NP
17	Opremanje dječjeg vrtića	2	3.1.1	u provedbi	112.566,38 kn	Općina Lumbarda	javni	Nabava opreme za dječji vrtić.	NP
18	Opremanje dječjeg vrtića Radost, Vela Luka	2	3.1.1	u provedbi	161.370,00 kn	Općina Vela Luka	javni	Nabava opreme, dopremanje i montiranje.	NP
19	Adaptacija skladišta za čuvanje voća i povrća	3	1.1.1	u provedbi	214.441,75	Općina Lastovo	Gospodarski	Rekonstrukcija i adaptacija skladišta za skladištenje voća i povrća površine 79 m ² : 1. Građevinski i građevinsko-obrtnički radovi, vodovodni i kanalizacijski radovi, elektroinstalacijski radovi, sve sukladno glavnom projektu i troškovniku; 2. Izrada projektno tehničke dokumentacije (idejna studija, glavni projekt, troškovnik i nadzor).	NP
20	Modernizacija rada na poljoprivrednom gospodarstvu	3	1.1.1	u provedbi	99.338,82	Općina Lastovo	Gospodarski	Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme: 1. Traktor (snaga do 36,4 kW); 2. Freza (radni zahvat 125 cm, br.noževa 36); 3. Malčar (radni zahvat 115 cm); 4. Motorna pila (snaga 3 kW); 5. Motorna kosa (snaga 1,7 kW).	NP
21	Nabava gospodarskog vozila i opreme za rezidbu i	3	1.1.1	u provedbi	75.109,60	Grad Korčula	Gospodarski	Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskog vozila: 1. Motorna drobilica za granje (snaga 15 ks); 2. Gospodarsko vozilo (radni volumen 1499 ccm).	NP

	obradu maslinika								
22	Nabava gospodarskog vozila	3	1.1.1	u provedbi	83.750,00	Općina Orebić	Gospodarski	Nabava novog gospodarskog vozila: 1. "Pick up" vozilo, pogon 4x4, nosivost do 1250 kg.	NP
23	Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju za stočarstvo	3	1.1.1	u provedbi	222.375,00	Općina Orebić	Gospodarski	Nabava nove poljoprivredne mehanizacije: 1. preša za kockaste bale (80 udaraca/min i 540 okr/min); 2. Traktor (snaga do 55 kW).	NP
24	Dom kulture u Lastovu	4	3.1.1	u provedbi	130,623.77	Općina Lastovo	Civilni	Opremanje doma kulture, prema dostavljenom troškovniku.	NP
25	Opremanje Dječjeg vrtića Orebić	4	3.1.1	u provedbi	267,822.00	Općina Orebić	javni	Opremanje dječjeg vrtića, prema dostavljenom troškovniku.	NP
26	Opremanje Kneževog dvora	4	3.1.1	u provedbi	297,146.25	Općina Ston	javni	Opremanje doma kulture i turističko informativnog centra, prema dostavljenom troškovniku.	NP
27	Dječji vrtić Lastavica	4	3.1.1	u provedbi	295,134.00	Općina Lastovo	javni	Opremanje dječjeg vrtića, prema dostavljenom troškovniku.	NP
28	Opremanje dječjeg igrališta	4	3.1.1	u provedbi	174,312.50	Općina Janjina	javni	Opremanje dječjeg igrališta, prema dostavljenom troškovniku.	NP

PRILOG 2 Pregled provedbe aktivnosti ublažavanja rizika

Naziv rizika	Predviđene preventivne aktivnosti	Provođenje
Nedovoljno usavršavanje zaposlenika i suradnika LAG-a i nedostatan stjecanje novih znanja i vještina planiranja i upravljanja razvojnim projektima.	Nastavak sustavne provedbe stalnog usavršavanja zaposlenika i suradnika LAG-a, korištenje učinkovito korištenje svih vanjskih resursa (LmH, županijskih i državnih te inozemnih) stalna podražka UO LAG-a za jačanje kapaciteta LAG-a. Potpora UO i članova za jačanje kapaciteta LAG-a.	Uz kontinuiranu podršku UO, zaposlenici LAG-a 5 se kontinuirano educiraju sudjelovanjem na edukacijama vezanim uz stjecanje znanja i vještina vođenja razvojnim projektima, u organizaciji različitih pravnih osoba. Dvije od trenutno četiri zaposlene osobe u uredu LAG-a imaju završeno osposobljavanje za upravljanje EU financiranim projektima.
Ograničenja i nemogućnost angažiranja novih suradnika, posebno onih zainteresiranih, motiviranih i spremnih za rad na projektima ruralnog razvoja i rad s lokalnim zajednicama.	Nastavak sustavnog animiranja i privlačenja novih suradnika kroz volonterske, povremene i projektne angažmane. Osiguravanje dobrih radnih uvjeta i suradničke atmosfere. Osiguravanje financijskih uvjeta LAG-a za privlačenje novih suradnika.	Ured LAG-a 5 je osigurao dobre radne i financijske uvjete čime je osigurao kontinuirani angažman od minimalno četiri suradnika zaposlenih na različitim projektima i onih angažiranih na ugovorima o volontiranju.
Nedovoljna upućenost i manjak vještina članova lokalnog partnerstva za sustavno praćenje i bavljenje razvojnim potrebama na području LAG-a.	Organiziranje i provedba edukacije i treninga, sudjelovanje na skupovima i konferencijama, sudjelovanje u stručnim sastancima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, razmjena iskustava s drugim LAG-ovima.	Kroz provedbu mjere 19 PRR-a RH i projekte financirane iz drugih fondova LAG-5 je osigurao sudjelovanje zaposlenika, članova UO i volontera na različitim edukacijama, konferencijama, razmjeni iskustava i sl.
Sukob interesa u radu LAG-a i donošenje odluka.	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa, sa jasnim i transparentnim pravilima i uputama. Uspostava procedura i postupaka za upravljanje konfliktnim situacijama i izbjegavanje sukoba interesa. Osiguranje potpune transparentnosti svih aktivnosti i svih postupaka donošenja odluka.	Uspostavljen je interni sustav za izbjegavanje sukoba interesa.
Ograničavanja inoviranja aktivnosti LAG-am novih inicijativa i inovativnih projekata ruralnog i lokalnog razvoja, koje pokreću suradnici LAG-a.	Nastavak planiranja novih inicijativa i inovativnih projekata, informiranja i uključivanja lokalnog partnerstva, sustavna stimulacija podrška od UO LAG-a.	LAG-5 kontinuirano prijavljuje nove projekte te sudjeluje u lokalnim partnerstvima.
Preuzimanje dodatnih odgovornosti bez osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.	Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja.	Osiguran je financijski monitoring poslovanja na polugodišnjoj razini. Uspostavljen je sustav volontiranja.
Promjena smjernica u javnim politikama Vlade RH posebno vezanih uz provedbu	Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR. Suradnja s LEDAER	Razvijena je suradnja s LEADER mrežom Hrvatske s MP i APRRR. Zaposlenici ureda LAG-a kontinuirano prate promjene vezane uz provedbu

Programa ruralnog razvoja i djelovanje udruga.	mrežom Hrvatske, kao tehničkom pomoći, suradnja s Upravnom direkcijom i APPRR-om.	PRR-a i djelovanje udruga te sudjeluju u s tim povezanim edukacijama.
Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika podmjere 19.2 i Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.	Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“. Pojačane aktivnosti vezane uz osiguravanje finansijskih sredstava finansijskih institucija i organizacija.	Sredstva za predfinanciranje aktivnosti LAG-a su osigurana kreditom ERSTE banka.

PRILOG 3 Pregled projekata i aktivnosti LAG-a financiranih izvan M19 PRR-a

Naziv projekta	Uloga LAG-a	Izvor financiranja	Područje provedbe	Razdoblje provedbe
HNV-LINK: POLJOPRIVREDA NA PODRUČJIMA VIŠOKE PRIRODNE VRIJEDNOSTI: UČENJE, ZNANOST I INOVACIJE	partner, nacionalni koordinator	HORIZON 2020	UK, PORTUGAL, RH, RUMUNJSKA, BUGARSKA, ŠVEDSKA, FRANCUSKA, IRSKA, GRČKA, ŠPANJOLSKA, FINSKA	01.04.2016.-31.03.2019.
PRISMI- PROMOVIRANJE INTEGRACIJE OIE ZA PAMETNE MEDITERANSKE OTOKE	pridruženi partner	INTEREG MED	CIPAR, GRČKA, MALTA, RH, ITALIJA	11/2016-04/2018
BLUTOURSYSTEM – PLATFORMA ZNANJA, VJEŠTINA I KREATIVNE SURADNJE ZA RAZVOJ EKOSUSTAVA PLAVOG TURIZMA	partner	INTEREG IT-HR	Italija - regije Veneto i Puglia, Hrvatska - Istarska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija	01.01.2018.-30.09.2019.
Želim pomagati	nositelj	ESF, OP ULJP	LAG 5	08.07.2019.-08.01.2020.
UČI DALJE	partner	ESF, OP ULJP	OTOK KORČULA	26.03.2019.-21.03.2021.
OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI	partner	ESF, OP ULJP	OTOK KORČULA	26.03.2019.-21.03.2021.
„RURAL 3.0. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SLUŽBI RURALNOG RAZVOJA“	partner	ERASMUS +	LAG 5	01.01.2019.-31.12.2021.
WEB 'N' WORK	partner	ESF, OP ULJP	DNŽ	26.03.2019.-25.03.2020.
RUR'UP	pridruženi partner	ERASMUS +	EU	01.09.2020.-31.08.2022.
„ADULT EDUCATION FOR SUSTAINABLE CULTURE“	koordinator	ERASMUS +	PORTUGAL, RH	07.08.2020.-06.08.2021.
LAG 5 fest	organizator	DNŽ	-	

PRILOG 4 Pregled objavljenih LAG natječaja

R.B.	LAG natječaj	TO LRS	Datum raspisivanja	Inicijalno raspoloživa sredstva	Datum izmjene	Konačna raspoloživa sredstva	Br. prijava	Br. odabranih projekata	Odobrena financijska sredstva LAG razina	Odobrena financijska sredstva - APPRRR
1.	Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.4	16.03.2018.	781,746.00	13.11.2018.	1,675,170.00	20	15	1,675,170.00	1,563,492.00
2.	Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo	3.1.1	03.04.2019.	1,779,000.00	NP	1,779,000.00	10	4	799,258.46	799,258.46
3.	Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	23.09.2019.	790,024.25	NP	790,024.25	6	5	695,015.17	695,015.17
4.	Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo	3.1.1	04.12.2019.	979,741.54	26.06.2020.	1,303,198.22	7	5	1,303,198.22	1,165,038.52
5.	Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.4	26.06.2020.	569,250.00	NP	569,250.00	25	5	569,250.00	NP
6.	Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	26.06.2020.	450,557.12	NP	450,557.12	2	2	230,900.68	NP
7.	Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	20.11.2020.	219,656.44	NP	219,656.44	NP	NP	NP	NP
8.	Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima	2.1.2	20.11.2020.	898,176.00	NP	898,176.00	NP	NP	NP	NP

PRILOG 5 Popis aktivnosti Upravnog odbora LAG-a 5 vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. - 2019. godine

R. B.	Datum	Odluke/Aktivnosti
1.	15.03.2018.	Odluka o formiranju Ocjenjivačkog odbora LAG 5 natječaja
		Odluka o donošenju Pravilnika za odabir projekata na natječajima LAG-a 5
		Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za objavu LAG 5 Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odobrenju konačnog teksta Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ zajedno s priložima i obrascima
		Odluka o raspisivanju LAG 5 Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava
2.	21.03.2018.	Odluka o tehničkoj izmjeni LAG 5 natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
3.	21.05.2018.	Odluka o imenovanju članova ocjenjivačkog odbora za natječaj 1.1.4. LAG-a 5
4.	18.07.2018.	Odluka o pokretanju projekta suradnje Bee Friends
5.	13.11.2018.	ODLUKA o Izmjeni LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LAG-a 5
		Odluke o odbijanju projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LAG-a 5
6.	03.04.2019.	Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za objavu LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
		Odluku o odobrenju konačnog teksta LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
		Odluka o raspisivanju LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“

7.	30.04.2019.	O D L U K A O P O N I Š T E N J U Izjava korisnika koji su odabrani na 1. LAG 5 natječaju za TO 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
8.	24.07.2019.	Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
9.	23.09.2019.	Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za objavu LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Odluka o odobrenju konačnog teksta LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Odluka o raspisivanju LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijave LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
10.	22.10.2019.	Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Odluke o odbijanju u projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ ODLUKA O IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (referentna oznaka: 19/1.1.1.)
11.	04.12.2019.	Odluka o odobrenju konačnog teksta 4. LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Odluka o raspisivanju 4. LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijave 4. LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 4. LAG 5 Natječaj 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
12.	25.05.2020.	Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Odluka o odbijanju u projekta prijavljenog na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
13.	26.06.2020.	Odluka o izmjeni 4. LAG 5 natječaja za provedbu TO 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ LAG-a 5. Odluka o odobrenju konačnog teksta 5. LAG 5 Natječaja TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

		Odluka o raspisivanju 5. LAG 5 Natječaja TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odobrenju konačnog teksta 6. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o raspisivanju 6. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
14.	20.10.2020.	Odluka o odbijanju u projekta prijavljenog na 5. Natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o rezultatu administrativne kontrole projekta prijavljenog na 5. Natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odabiru projekata prijavljenih na 6. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
15.	20.11.2020.	Odluka o odobrenju konačnog teksta 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o raspisivanju 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 7. LAG 5 Natječaj TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odobrenju konačnog teksta 8. LAG 5 Natječaja za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
		Odluka o raspisivanju 8. LAG 5 Natječaja za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
		Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava 8. LAG 5 Natječaja za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
		Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 8. LAG 5 Natječaj za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
		Odluka o odabiru projekata prijavljenih na 5. LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
		Odluka o odbacivanju projekata prijavljenih na 5. LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
